T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

2018 YILI
YATIRIM PROGRAMI
GERÇEKLEŞMELERİ

(Ocak 2019)

İÇİNDEKİLER

1. 2018 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ..... I
2. 2018 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ..... II
3. 2018 YILI İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ..... III

1- Bülent Ecevit Üniversitesi..... 1
2- TTK Genel Müdürlüğü..... 2
3- Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü..... 3
4- DSİ 23 Bölge Müdürlüğü 4
5- İller Bankası A.Ş. Kastamonu Bölge Müdürlüğü 7
6 Ulaştırma ve Altyapı XIII Böl.Müd..... 8
7- Orman Bölge Müdürlüğü 9
8- TCDD 2.Bölge Müdürlüğü 10
9- TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü..... 11
10- Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 12
11- İl Milli Eğitim Müdürlüğü..... 13
12- İl Sağlık Müdürlüğü 15
13- İl Özel İdaresi 16
14- İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü..... 29
15- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü..... 30
16- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 31
17- Orman ve Su işleri Zonguldak Şube Müdürlüğü..... 32
18- İL Afet acil Durum Müdürlüğü 33
19- Tapu Kadastro 19. Bölge Müdürlüğü 34
20- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü..... 35
21- Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 36
22- İl Jandarma Komutanlığı..... 37
23- İl Emniyet Müdürlüğü..... 38

2018 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

(Bin TL)

SIRA NO	YATIRIMCI KURULUŞ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
							NAKDİ (%)	FİZİKİ (%)
1	BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ	8	132.280,00	50.974,00	65.223,00	46.361,00	71	66
2	TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	4	217.882,00	0,00	144.519,00	81.145,00	56	34
3	KARAYOLLARI 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	13	6.168.042,00	1.506.729,00	225.472,00	225.467,00	100	30
4	DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	43	318.842,00	91.581,00	44.310,00	44.280,00	100	47
5	İLLER BANKASI A.Ş. KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	9	50.661,00	16.688,00	33.007,00	9.974,00	30	75
6	ULAŞTIRMA VE ALTYAPI XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	3	685.642,00	281.724,00	253.161,00	239.908,00	95	52
7	ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	7	65.962,00	0,00	65.962,00	64.903,00	98	88
8	TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	8	25.421,00	10.111,00	6.683,00	6.089,00	91	50
9	TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	4	158.000,00	13.852,00	41.083,00	26.081,00	63	44
10	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	5	38.637,00	14.808,00	22.801,00	10.203,00	45	68
11	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	29	203.214,00	26.307,00	68.989,00	47.526,00	69	34
12	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	9	122.878,00	962,00	56.206,00	54.221,00	96	79
13	İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ	238	103.634,00	4.028,00	98.649,00	85.008,00	86	95
14	İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	38.579,00	15.267,00	5.474,00	5.474,00	100	50
15	GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	6	34.285,00	28.416,00	791,00	791,00	100	92
16	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	5	472,00	363,00	2.541,00	2.541,00	100	100
17	ORMAN VE SU İŞLERİ ZONGULDAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	4	576,00	0,00	576,00	481,00	84	100
18	İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	1	1.233,00	703,00	530,00	109,00	21	100
19	TAPU KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	2.931,00	698,00	1,00	1.080,00	108.000	100
20	AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	2	24.275,00	13.646,00	10.012,00	2.088,00	21	63
21	BAŞKENT ELEKTİRİK DĞITIM A.Ş.	8	73.900,00	0,00	73.900,00	73.900,00	100	100
22	İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	7	5.946,00	1.862,00	3.668,00	3.668,00	100	100
23	İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	14	14.775,00	8.907,00	7.792,00	5.107,00	66	96
TOPLAM		**431**	**8.488.067,00**	**2.087.626,00**	**1.231.350,00**	**1.036.405,00**	**84**	**80**

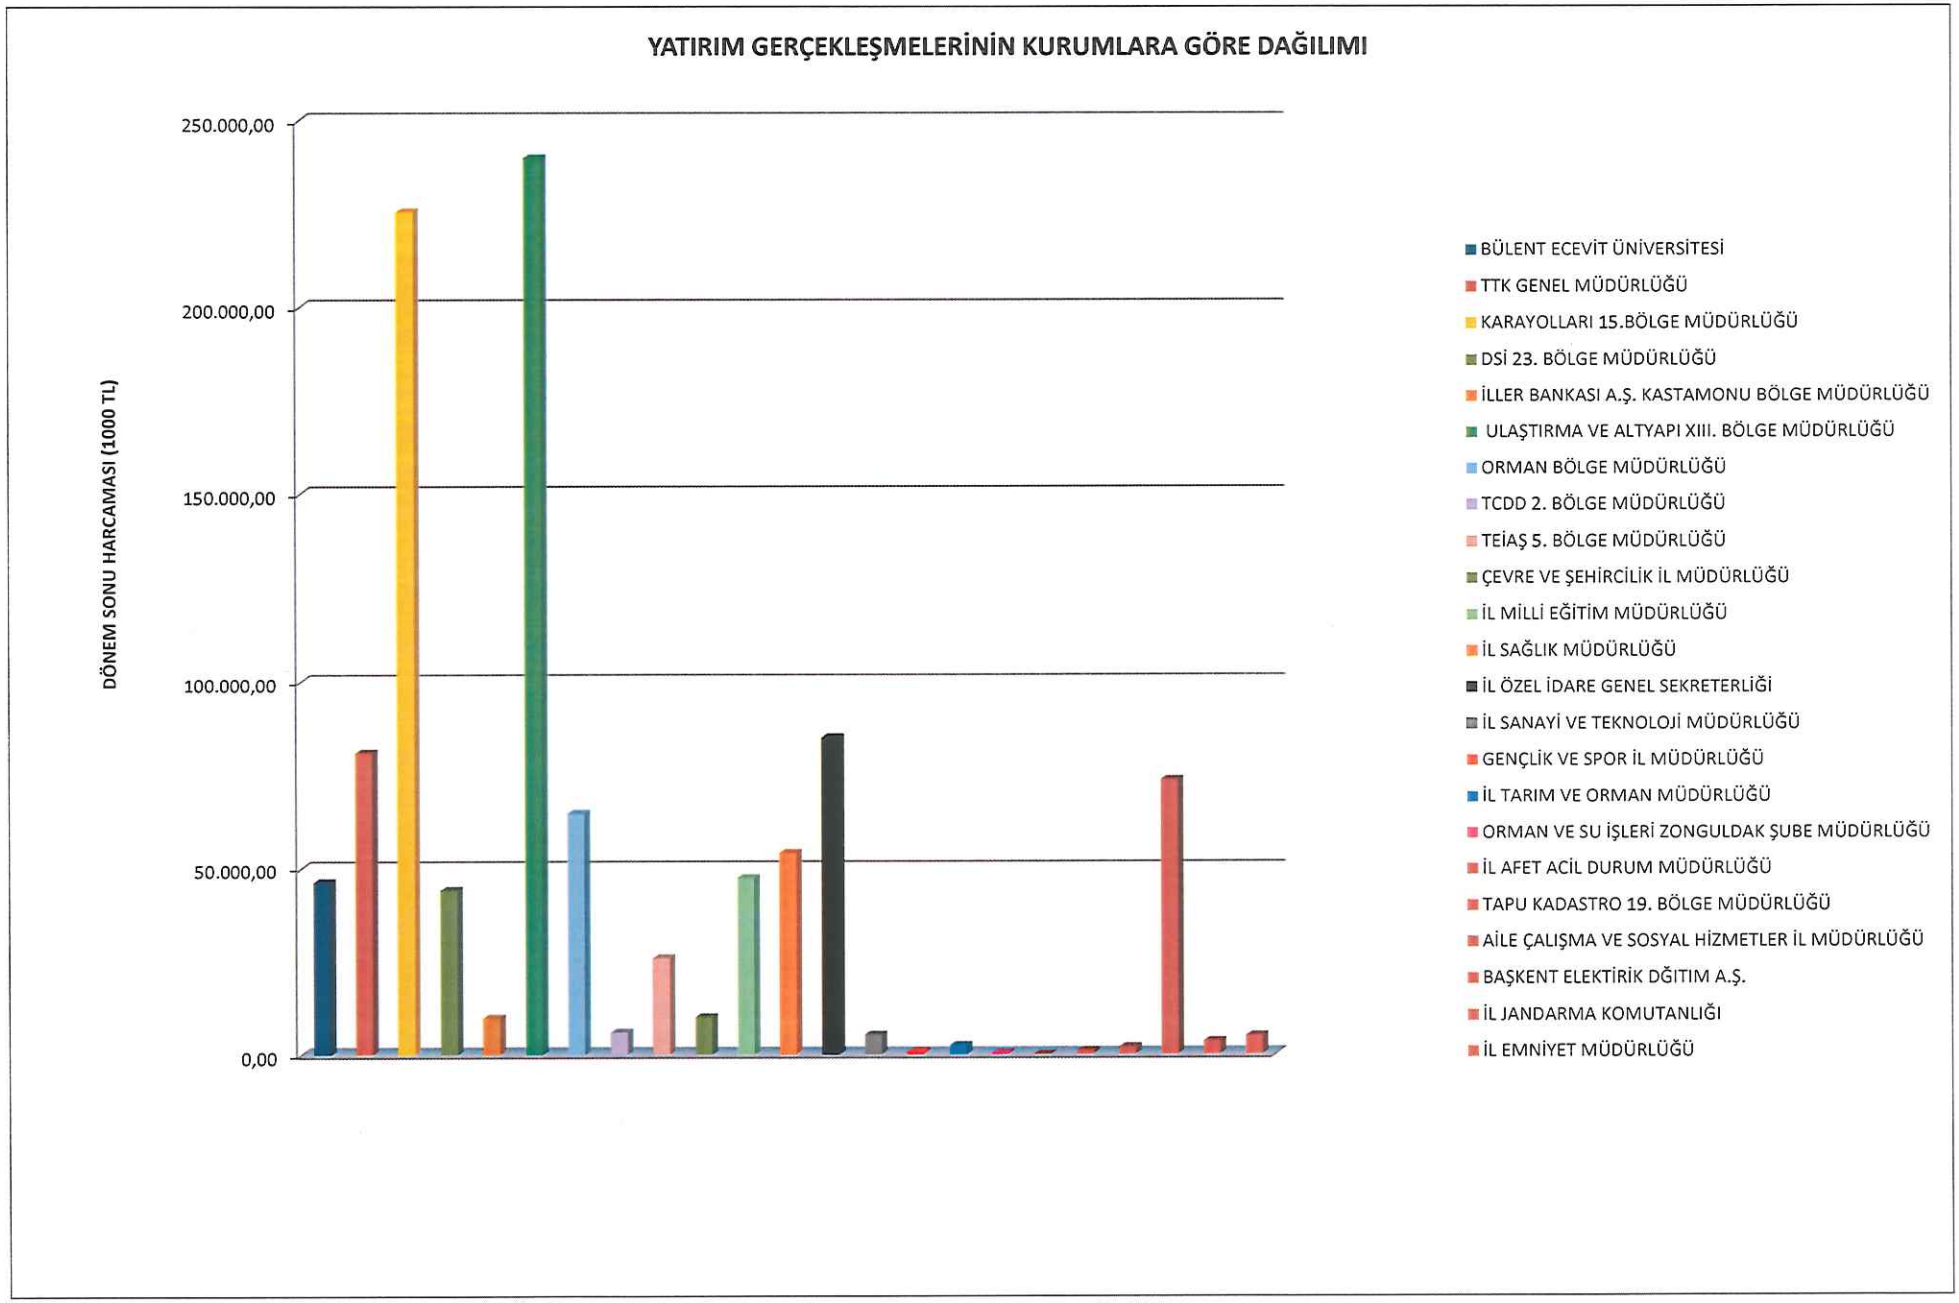
YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİNİN KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI
DÖNEM SONU HARCAMASI (1000 TL)
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İLLER BANKASI A.Ş. KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ
İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN VE SU İŞLERİ ZONGULDAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKENT ELEKTİRİK DĞITIM A.Ş.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

(Bin TL)

S NO	SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
							NAKDİ (%)	FİZİKİ (%)
1	TARIM	51	376.409,00	87.363,00	108.323,00	107.251,00	99	54
2	MADENCİLİK	4	217.882,00	-	144.519,00	81.145,00	56	34
3	ENERJİ	12	231.877,00	13.852,00	114.960,00	99.958,00	87	81
4	ULAŞTIRMA	182	6.960.688,00	1.798.564,00	566.970,00	542.077,00	96	88
5	TURİZM	4	576,00	-	576,00	481,00	84	100
5	EĞİTİM	37	335.494,00	77.281,00	134.212,00	93.887,00	70	41
6	SAĞLIK	9	122.878,00	962,00	56.206,00	54.221,00	96	79
7	DKH	132	242.234,00	109.604,00	105.575,00	57.355,00	54	91
TOPLAM		**431**	**8.488.038,00**	**2.087.626,00**	**1.231.341,00**	**1.036.375,00**	**84**	**80**

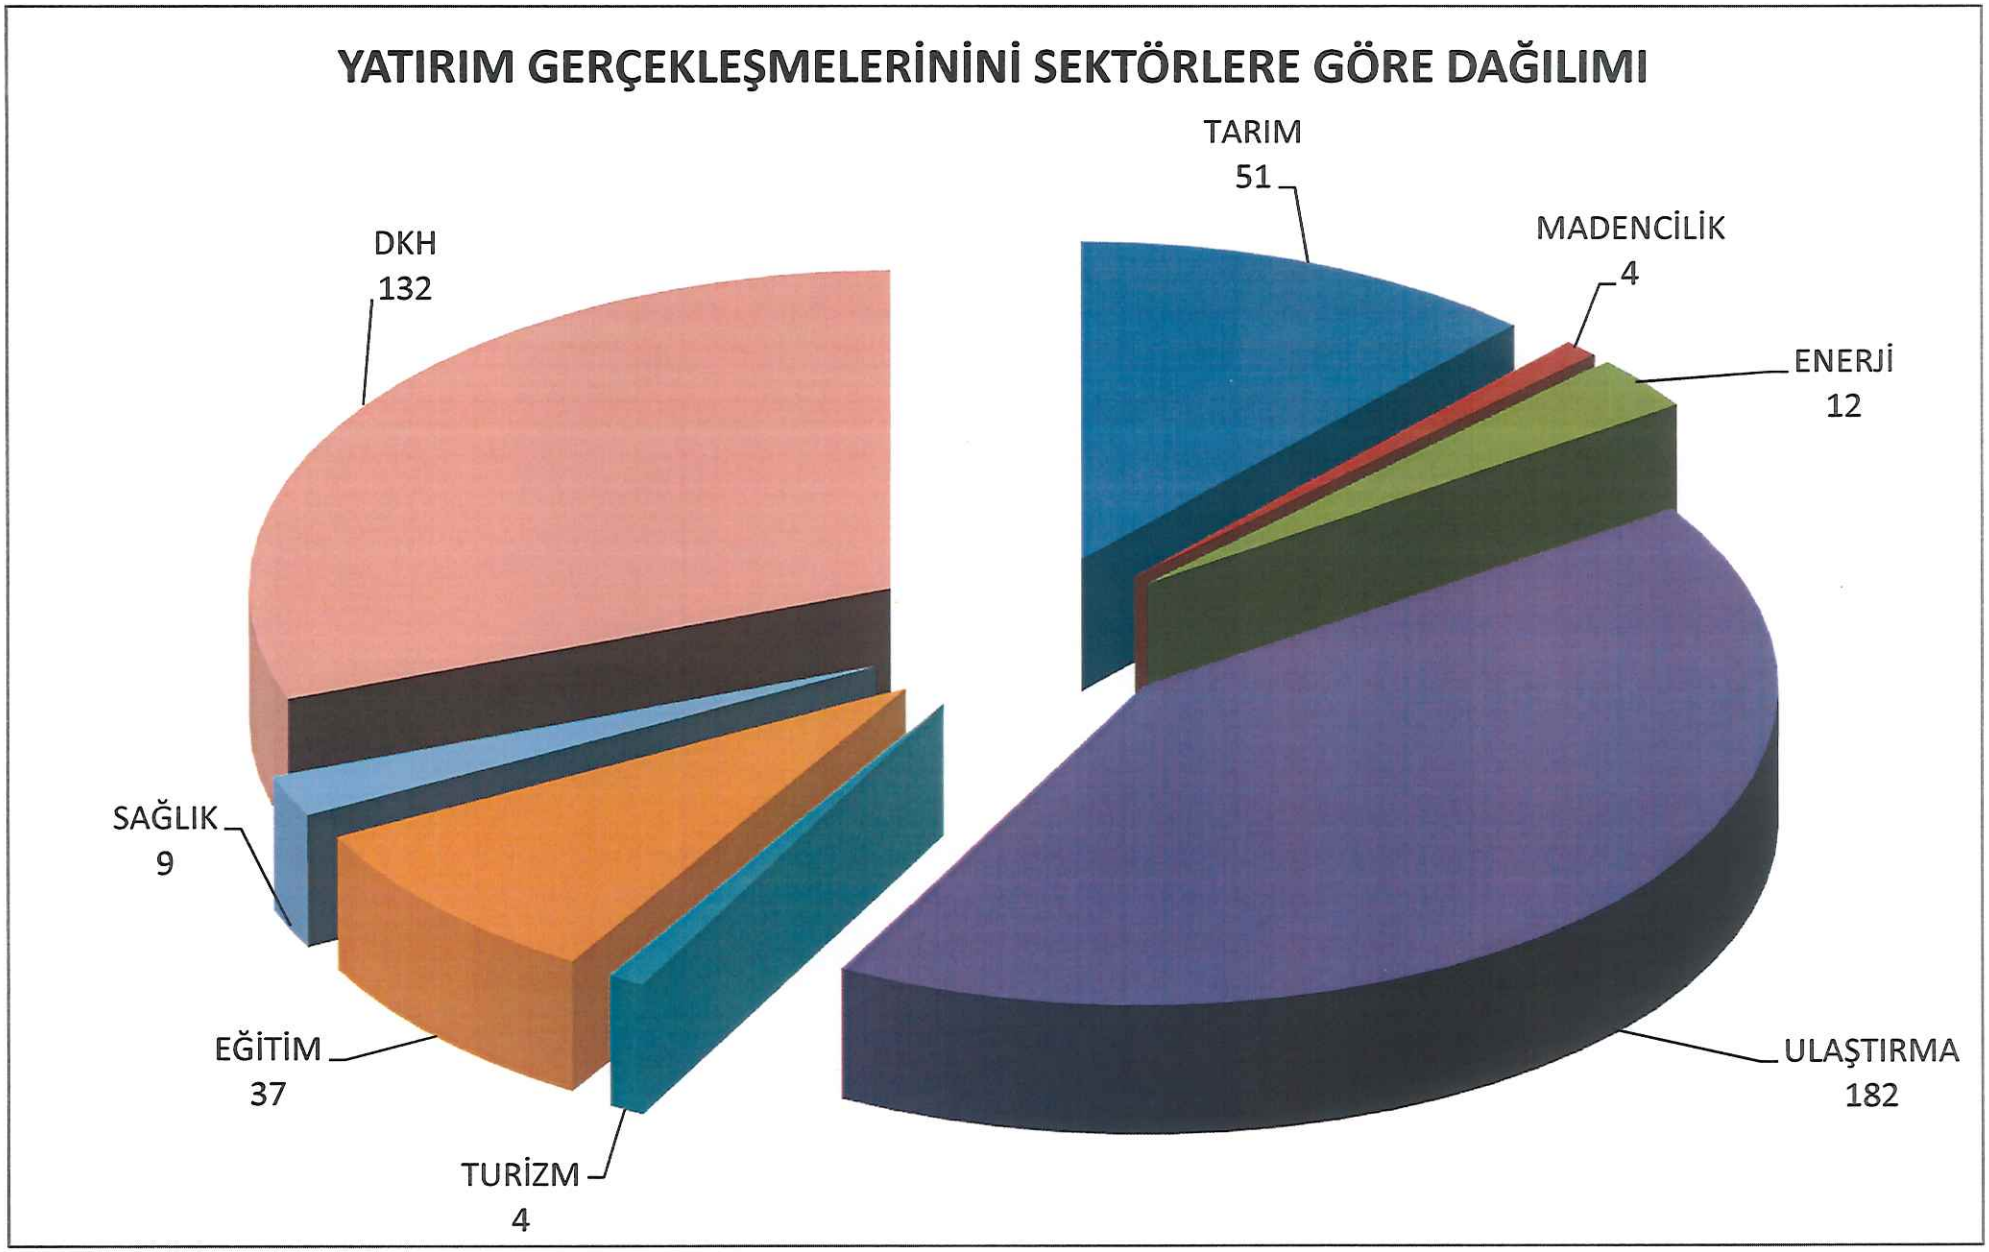
YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİNİNİ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
TARIM
51
MADENCİLİK
4
ENERJİ
12
ULAŞTIRMA
182
TURİZM
4
EĞİTİM
37
SAĞLIK
9
DKH
132

2018 YILI İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞME İCMALİ

(Bin TL)

SIRA NO	İLÇESİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
							NAKDİ (%)	FİZİKİ (%)
1	MERKEZ	89	5.460.876,00	734.105,00	457.134,00	341.566,00	75	80
2	ALAPLI	40	216.650,00	31.497,00	25.995,00	17.515,00	67	68
3	ÇAYCUMA	61	965.242,00	347.226,00	309.855,00	291.182,00	94	75
4	DEVREK	40	878.058,00	522.085,00	105.869,00	95.523,00	90	71
5	KDZ.EREĞLİ	88	711.361,00	412.636,00	155.315,00	142.694,00	92	83
6	GÖKÇEBEY	31	54.651,00	9.028,00	34.383,00	24.442,00	71	87
7	MUHTELİF	33	85.098,00	2.048,00	71.124,00	71.601,00	101	94
8	KOZLU	32	52.517,00	8.752,00	29.242,00	24.095,00	82	80
9	KİLİMLİ	17	63.585,00	20.249,00	42.424,00	27.757,00	65	91
TOPLAM		**431**	**8.488.038,00**	**2.087.626,00**	**1.231.341,00**	**1.036.375,00**	**84**	**80**

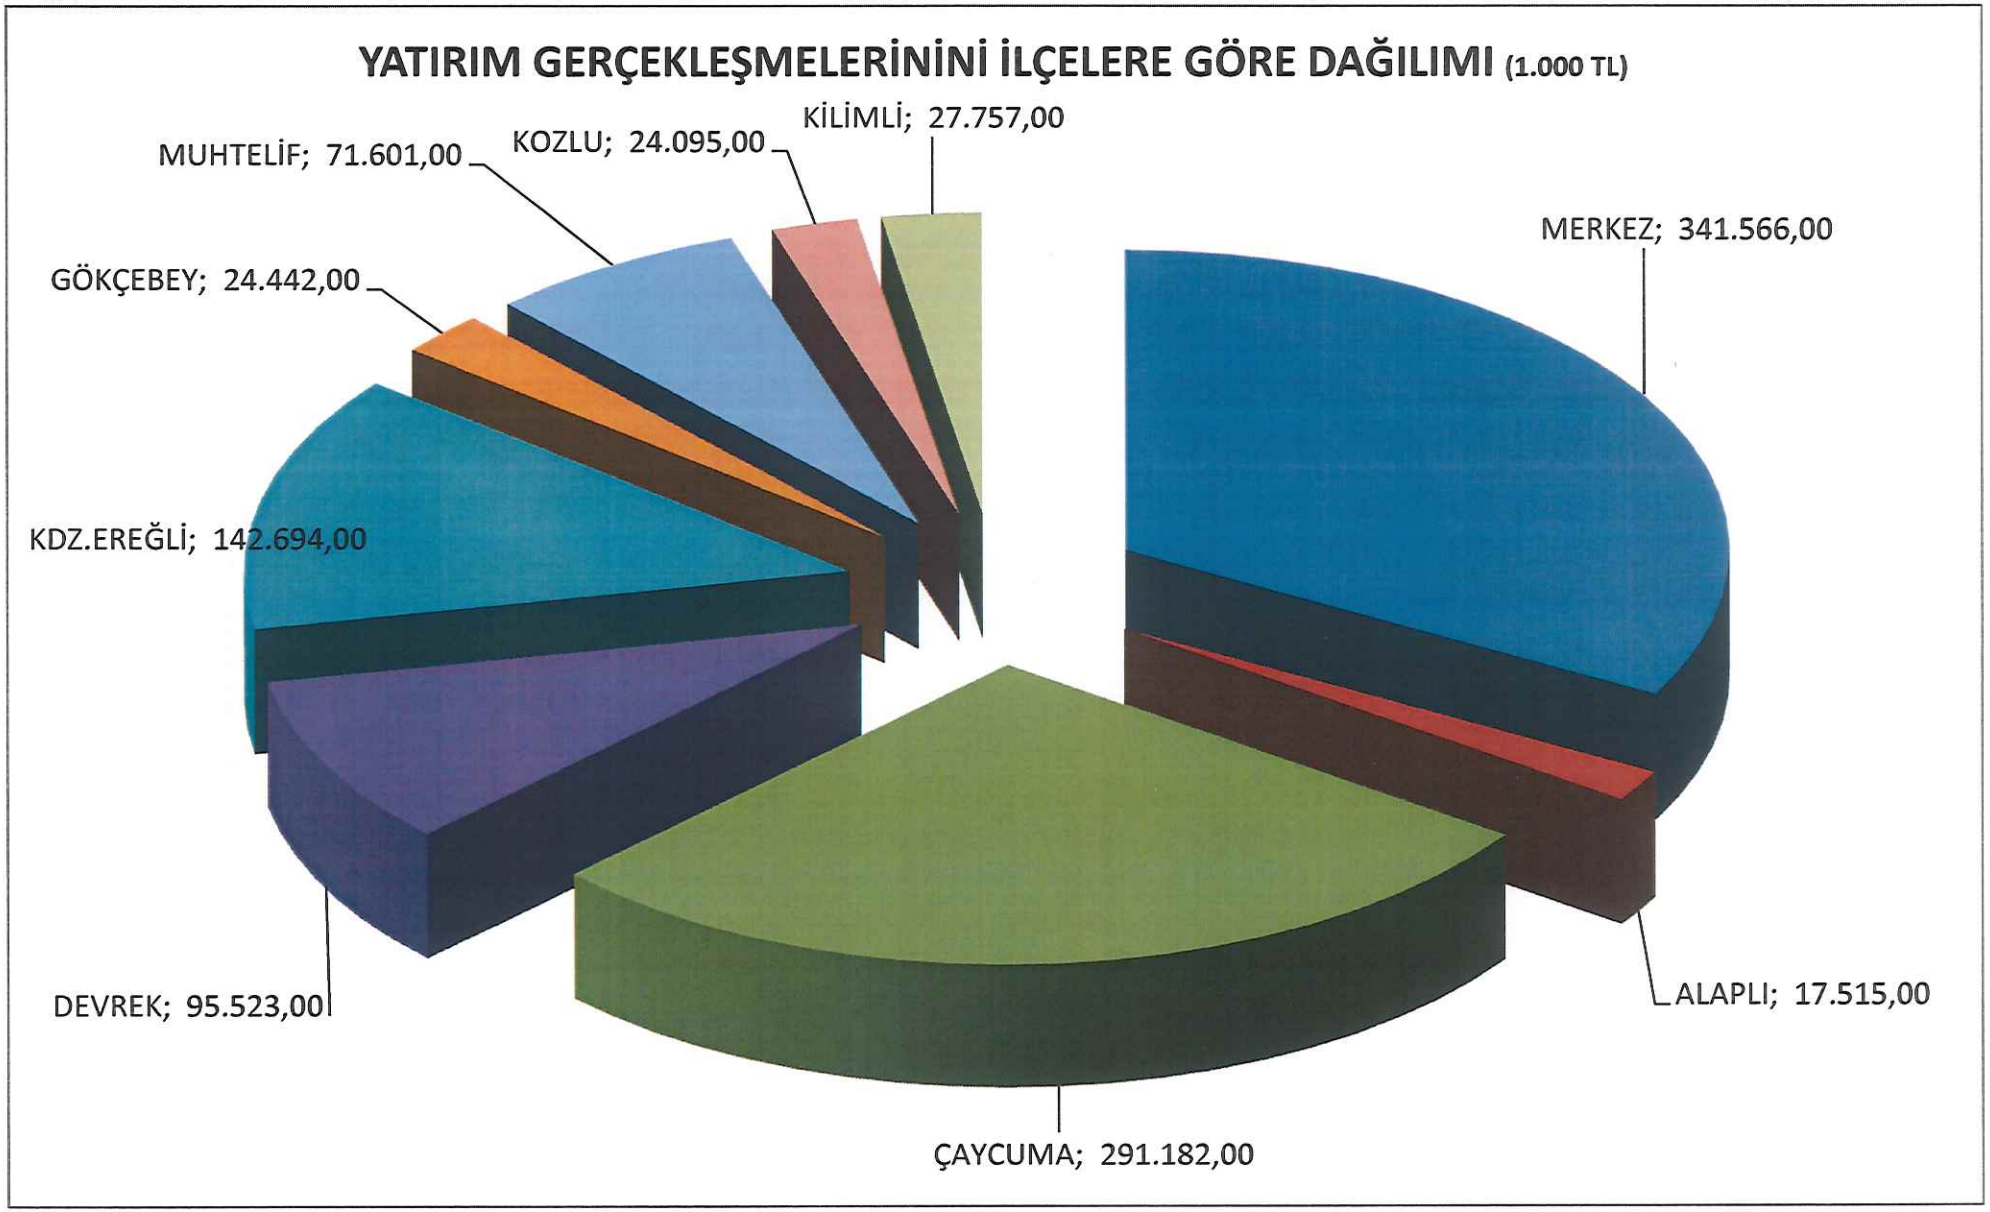
YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİNİNİ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI (1.000 TL)
KİLİMLİ; 27.757,00
KOZLU; 24.095,00
MUHTELİF; 71.601,00
GÖKÇEBEY; 24.442,00
MERKEZ; 341.566,00
KDZ.EREĞLİ; 142.694,00
DEVREK; 95.523,00
ALAPLI; 17.515,00
ÇAYCUMA; 291.182,00

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	2018H031180	EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	MERKEZ	2018-2018	100,00	0,00	100,00	84,00	84	85
2	2006H032900	EĞİTİM	Derslikler ve Merkezi Birimler	MERKEZ	2009-2020	52.956,00	3.622,00	41.251,00	25.492,00	62	62
3	2009H032610	EĞİTİM	Kampüs Altyapısı	MERKEZ	2009-2020	59.352,00	47.352,00	4.000,00	3.801,00	95	86
4	2018H031240	EĞİTİM	Muhtelif İşler	MERKEZ	2018-2018	5.900,00	0,00	5.900,00	5.737,00	97	97
5	2018H031420	EĞİTİM	Yayın Alımı	MERKEZ	2018-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	802,00	80	80
6	2018H050650	EĞİTİM	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	MERKEZ	2018-2018	2,00	0,00	2,00	0,00	0	0
7	2018I000230	EĞİTİM	Muhtelif İşler	MERKEZ	2018-2018	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,00	100	100
8	2018K120190	EĞİTİM	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	MERKEZ	2018-2018	2.970,00	0,00	2.970,00	447,00	15	15
TOPLAM						132.280,00	50.974,00	65.223,00	46.361,00	71	66

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	2012B030010	MADENCİLİK	Etüd-Proje	MERKEZ	2012-2019	839,00	0,00	145,00	0,00	0	0
2	2011B030180	MADENCİLİK	Üretimde Mekanizasyon-etüd-Proje, Makine Techizat	MERKEZ	2014-2020	93.900,00	0,00	21.231,00	0,00	0	0
3	2018B000032	MADENCİLİK	Arama İhzarat-1964m Galeri, 150 m Kuyu	MERKEZ	2018-2018	44.410,00	0,00	44.410,00	34.230,00	77	77
4	2018B000080	MADENCİLİK	Muhtelif İşler	MERKEZ	2018-2018	78.733,00	0,00	78.733,00	46.915,00	60	60
TOPLAM						217.882,00	0,00	144.519,00	81.145,00	56	34

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	93E040860	ULAŞTIRMA	Bartın Çaycuma(Devrek-Zonguldak)Ayrımı	ÇAYCUMA	2003-2021	40.342,00	17.052,00	1,00	0,00	0	0
2	05E040240	ULAŞTIRMA	Çaycuma-Zonguldak Ayrımı_Devrek 4. Bölge Hududu	DEVREK	2005-2021	345.505,00	169.533,00	44.752,00	44.752,00	100	72
3	06E040700	ULAŞTIRMA	Devrek-Çaycuma Ayrımı Zonguldak	MERKEZ	2006-2021	192.128,00	20.209,00	68.251,00	68.251,00	100	56
4	74E040450	ULAŞTIRMA	Zonguldak Ereğli(Ereğli Çevre Yolu Dahil)(ZBK)	KDZ.EREĞLİ	1974-2021	409.203,00	311.643,00	32.403,00	32.403,00	100	78
5	97E040350	ULAŞTIRMA	Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide	MERKEZ	1997-2021	4.502.228,00	588.379,00	19.086,00	19.086,00	100	10
6	77E042080	ULAŞTIRMA	Devrek Zonguldak Ayrımı-Karabük-Safranbolu	DEVREK	1977-2021	391.839,00	325.049,00	1,00	0,00	0	17
7	1986E040360	ULAŞTIRMA	Ereğli Çevre Yolu	KDZ.EREĞLİ	2012-2019	53.647,00	16,00	100,00	100,00	100	0
8	64E042100	ULAŞTIRMA	Çaycuma-Perşembe Kozcağız	ÇAYCUMA	1996-2020	42.975,00	22.485,00	1,00	0,00	0	100
9	86E040380	ULAŞTIRMA	Ereğli Devrek Yolu	KDZ.EREĞLİ	2004-2019	70.336,00	52.063,00	55.992,00	55.992,00	100	50
10	86E040380	ULAŞTIRMA	Devrek Zonguldak Ayrımı-Beycuma Devrek Ereğli Ayrımı	DEVREK	2011-2019	15.919,00	30,00	4.883,00	4.883,00	100	3
11	2003E040260	ULAŞTIRMA	Gökçebey Tefan Köprüsü	GÖKÇEBEY	2016-2021	2.220,00	270,00	1,00	0,00	0	0
12	1996E040360	ULAŞTIRMA	Yığılca Alaplı	ALAPLI	2017-2021	96.700,00	0,00	1,00	0,00	0	0
13	2003E040260	ULAŞTIRMA	Kozlu Köprülü Kavşağı	KOZLU	2018-2021	5.000,00	0,00	1,00	0,00	0	0
TOPLAM						6.168.042,00	1.506.729,00	225.473,00	225.467,00	100	30

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	1013K050110	TARIM	Zonguldak-Ereğli İçmesuyu Arıtma Tesisi	KDZ.EREĞLİ	2013-2018	18.256,00	18.063,00	271,00	271,00	100	100
2	1013K050110	TARIM	Zonguldak-Ereğli İçmesuyu İsale Hattı	KDZ.EREĞLİ	2014-2018	26.985,00	22.730,00	867,00	867,00	100	87
3	1994A010610	TARIM	Filyos Çayı Taşkın Koruma 5. Kısım İnşşatı	ÇAYCUMA	2017-2019	103.633,00	6.999,00	17.500,00	17.500,00	100	24
4		TARIM	Filyos Çayı Taşkın Koruma	ÇAYCUMA	2015-2018	500,00	0,00	1,00	0,00	0	0
5		TARIM	Zonguldak-Ereğli İçmesuyu	KDZ.EREĞLİ	2014-2018	4.000,00	796,00	48,00	48,00	100	21
6		TARIM	Alaplı Çayı Yan Dere Bağlantılarının Yapılması	ALAPLI	2017-2019	2.033,00	0,00	1,00	0,00	0	0
7		TARIM	Alaplı Kocaman Deresi, Ereğli Çay Köy Güller ve Köroğlu ile Mollabey Köyü Karabulak	MUHTELİF	2018-2019	12.000,00	0,00	1,00	0,00	0	0
8		TARIM	Gümeli Bulanıkdere ve Aydınyayla Köyü Gökteoe Deresi	ALAPLI	2017-2019	7.997,00	0,00	472,00	472,00	100	6
9		TARIM	Alaplı Koğukavla Deresi ve kasımlı Köyü	ALAPLI	2017-2019	10.716,00	874,00	1.219,00	1.219,00	100	20
10		TARIM	Gelik Ayiçi Deresi ve Altıncı Sokak Deresi	KİLİMLİ	2016-2019	1.860,00	525,00	445,00	445,00	100	52
11		TARIM	Nebioğlu 1,2,3,4,5 nolu Kuru Dereler	ÇAYCUMA	2016-2019	2.088,00	588,00	143,00	143,00	100	35
12		TARIM	Ataköy Karasu Deresi İkmali	DEVREK	2018-2019	6.000,00	0,00	1,00	0,00	0	0
13		TARIM	Devrek Özbağı Deresi	DEVREK	2016-2019	2.474,00	0,00	750,00	750,00	100	30
14		TARIM	Filyos Yenice Çayı Tahkimat Taşı Temini	ÇAYCUMA	2018-2019	3.093,00	169,00	2.925,00	2.925,00	100	100
15		TARIM	Örmeci Köyü Örmeci Deresi	GÖKÇEBEY	2016-2019	7.511,00	1.846,00	843,00	843,00	100	36
16		TARIM	Kozlu Sanayi Köprüsü	KOZLU	2017-2019	2.765,00	0,00	1,00	0,00	0	0
17		TARIM	Göbü Köyü Göbü Deresi	KİLİMLİ	2016-2018	5.221,00	2.738,00	3.085,00	3.085,00	100	100
18		TARIM	Çaycuma Perşembe Deresi	ÇAYCUMA	2015-2018	5.155,00	4.737,00	228,00	228,00	100	100
19		TARIM	Devrek Çayı Islahı	DEVREK	2016-2019	30.092,00	8.001,00	3.700,00	3.700,00	100	39

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
20		TARIM	Devrek Çaylarla Deresi ve Sofular Deresi Islahı	DEVREK	2015-2018	3.530,00	3.499,00	30,00	30,00	100	100
21		TARIM	Kabasakal ve Kacaali Dreleri 2. Kısım İkmali	KDZ.EREĞLİ	2016-2019	5.913,00	3.354,00	1.176,00	1.176,00	100	77
22		TARIM	Beycuma Karardere Üzt Havza İkkmali ve Karapınar Köyü	MERKEZ	2016-2018	7.231,00	4.684,00	2.352,00	2.352,00	100	97
23		TARIM	Derebulaca ve Eveyikli Köyleri, Binnaz ve Kurudere Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	DEVREK	2017-2019	1.923,00	0,00	1,00	0,00	0	0
24		TARIM	Çaycuma Çömlekçiler Köyü Soğuksu Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi yapımı	ÇAYCUMA	2017-2019	861,00	0,00	1,00	0,00	0	0
25		TARIM	Yaraşlıyörük Köyü Kurudere 1,2,3 tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	KDZ.EREĞLİ	2017-2019	2.178,00	0,00	1,00	0,00	0	0
26		TARIM	Kozlu Deresi Rehabilitasyonu Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	KOZLU	2017-2019	1.336,00	0,00	1,00	0,00	0	0
27		TARIM	Devrek Çayı 2. Kısım	DEVREK	2018-2019	10.000,00	0,00	1,00	0,00	0	0
28		DKH	232 Şube ve Kurutma Tesisleri Onarımı	MERKEZ	2017-2018	1.714,00	1.391,00	321,00	321,00	100	100
29		DKH	232. Şube Tesisleri İkmali	MERKEZ	2017-2018	916,00	408,00	1,00	0,00	0	50
30		DKH	232. Şube Bina Tesislerinin Zemin İyileştirmesi	MERKEZ	2017-2018	4.671,00	1.795,00	3.467,00	3.437,00	99	100
31		TARIM	Alaplı Göleti	ALAPLI	2014-2019	19.741,00	6.497,00	2.981,00	2.981,00	100	48
32		DKH	Filyos Havzası Yerleşimleri İçmesuyu Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri	MUHTELİF	2012-2018	1.566,00	987,00	715,00	715,00	100	100
33		TARIM	İl Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 2. Kısım	MERKEZ	2014-2019	325,00	233,00	30,00	30,00	100	78
34		TARIM	Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolü 4. Kısım İstikşaf Raporları Hazırlanması	MERKEZ	2017-2019	488,00	166,00	260,00	260,00	100	87
35		TARIM	İl Taşkın Tesisleri Kati Proje Yapımı 1. Kısım	KOZLU	2016-2019	206,00	0,00	206,00	206,00	100	10
36		TARIM	İl Taşkın Tesisleri Kati Proje Yapımı 2. Kısım	MERKEZ	2016-2019	1.000,00	0,00	1,00	0,00	0	0
37		TARIM	İl Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 1. Kısım	MERKEZ	2016-2018	200,00	180,00	20,00	20,00	100	100
38		TARIM	İl Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 2. Kısım	MERKEZ	2017-2017	206,00	185,00	20,00	20,00	100	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
39		TARIM	Yukarı Havza Islahı Proje Yapımı	MERKEZ	2017-2018	1.000,00	0,00	1,00	0,00	0	0
40		TARIM	Kozlu Deresi Taşkın Koruma Proje Yapımı	MERKEZ	2017-2018	129,00	116,00	13,00	13,00	100	100
41		TARIM	Nebioğlu Madenler Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	ÇAYCUMA	2017-2019	229,00	0,00	152,00	152,00	100	66
42		TARIM	Elvanpazarcık Göleti Yapımı	MERKEZ	2017-2019	200,00	20,00	71,00	71,00	100	45
43		TARIM	Alaplı İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı	ALAPLI	2018-2019	900,00	0,00	1,00	0,00	0	0
TOPLAM						318.842,00	91.581,00	44.324,00	44.280,00	100	47

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İLLER BANKASI A.Ş KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1		DKH	Kilimli Kanalizasyon İnşaatı	KİLİMLİ	2017-2018	5.474,00	3.350,00	2.123,00	0,00	0	100
2		DKH	Filyos Derin Deşarj İnşaatı İkmal İnşaatı	ÇAYCUMA	2017-2018	273,00	0,00	273,00	272,00	100	100
3		DKH	Bakacakkadı-Gökçebey kanalizasyon İnşaatı	GÖKÇEBEY	2017-2018	11.221,00	5.950,00	5.270,00	1.470,00	28	100
4		DKH	Bakacakkadı eskipazar içmesuyu İkmal İnşaatı	GÖKÇEBEY	2018-2018	1.530,00	0,00	1.530,00	1.305,00	85	100
5		DKH	Çatalağzı Kanalizasyon İnşaatı	KİLİMLİ	2017-2018	9.047,00	2.884,00	6.162,00	2.143,00	35	100
6		DKH	Saltukova Kanalizasyon İnşaatı	ÇAYCUMA	2017-2018	7.027,00	2.807,00	4.221,00	968,00	23	100
7		DKH	Kozlu İçmesuyu İnşaatı	KOZLU	2017-2019	7.883,00	1.697,00	6.186,00	2.955,00	48	59
8		DKH	Nebioğlu Paket Atıksu artıma İnşaatı	ÇAYCUMA	2018-2019	964,00	0,00	1,00	0,00	0	0
9		DKH	Ereğli Katıatık Depolama Alanı Rehabilitasyonu	KDZ.EREĞLİ	2018-2019	7.242,00	0,00	7.242,00	861,00	12	12
TOPLAM						50.661,00	16.688,00	33.008,00	9.974,00	30	75

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HAB. XIII. BÖLGE MD. **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	2013E020130	ULAŞTIRMA	Filyos Liman İnşaatı	ÇAYCUMA	2013-2019	676.409,00	281.701,00	244.351,00	231.464,00	95	10
2	1017E020210	ULAŞTIRMA	Ereğli Kuzey Mendirek Onarımı	KDZ.EREĞLİ	2017-2019	9.000,00	0,00	8.600,00	8.351,00	97	96
3	2008E020060	ULAŞTIRMA	Alaplı Deresi Denize Çıkış Ağzı Mahmuzları Etüd-Proje İşleri	ALAPLI	2017-2019	233,00	23,00	210,00	93,00	44	50
TOPLAM						685.642,00	281.724,00	253.161,00	239.908,00	95	52

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	2018A050090	TARIM	Orman Kadastrosu	MUHTELİF	2018-2019	123,00	0,00	123,00	115,00	93	18
2	2018A050170	TARIM	Fidan Üretimi Projesi	GÖKÇEBEY	2018-2018	4.782,00	0,00	4.782,00	3.838,00	80	100
3	2018A050280	TARIM	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	MUHTELİF	2018-2018	297,00	0,00	297,00	298,00	100	100
4	2018A050290	TARIM	Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi	MUHTELİF	2018-2018	9.069,00	0,00	9.069,00	7.723,00	85	100
5	2018A050260	TARIM	Ağaçlandırma ve Orman Muhafaza Projesi	MUHTELİF	2018-2018	866,00	0,00	866,00	1.716,00	198	100
6		TARIM	Orman Köylerinin kalkındırılması ve Destekleme Projesi	MUHTELİF	2018-2018	4.365,00	0,00	4.365,00	4.378,00	100	100
7	2017A050110	TARIM	Ormanların Bakımı ve geliştirilmesi Projesi	MUHTELİF	2018-2018	46.460,00	0,00	46.460,00	46.835,00	101	100
TOPLAM						65.962,00	0,00	65.962,00	64.903,00	98	88

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	2017E0207	ULAŞTIRMA	Irmak - Zonguldak hattı Çatalağzı Gara 2 adet yaya üstgeçidi yapılması	KİLİMLİ	2015-2018	1.779,00	774,00	56,00	41,00	73	100
2	2017E0221	ULAŞTIRMA	Irmak-Zonguldak Hattı Km:367+079 da Çaycuma Üstgeçit Köprüsü Yapılması	ÇAYCUMA	2016-2018	19.637,00	8.886,00	6.235,00	5.661,00	91	100
3	2017E0236	ULAŞTIRMA	Irmak-Zonguldak Hattı Filyos İstasyonuna Yaya Üstgeçidi Yapılması	ÇAYCUMA	2017-2018	757,00	451,00	37,00	37,00	100	100
4	2017E0237	ULAŞTIRMA	Irmak-Zonguldak Hattı Saltukova İstasyonuna Yaya Üstgeçidi Yapılması	ÇAYCUMA	2017-2018	541,00	0,00	351,00	350,00	100	100
5	2017E0251	ULAŞTIRMA	Irmak-Zonguldak Hattı Km:378+220'de AltveyaÜstgeçit Yapılması	ÇAYCUMA	2018-2018	875,00	0,00	1,00	0,00	0	0
6	2017E0258	ULAŞTIRMA	Irmak-Zonguldak Hattı Km:379+530'de Alt veya Üst geçit Yapılması	ÇAYCUMA	2018-2018	551,00	0,00	1,00	0,00	0	0
7	2017E0261	ULAŞTIRMA	Irmak - Zonguldak hattı km:370+517'de üst geçit yapılması.	ÇAYCUMA	2018-2018	678,00	0,00	1,00	0,00	0	0
8	2017E0263	ULAŞTIRMA	Irmak - Zonguldak hattı km:368+448'de üst geçit yapılması	ÇAYCUMA	2018-2018	603,00	0,00	1,00	0,00	0	0
TOPLAM						25.421,00	10.111,00	6.683,00	6.089,00	91	50

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : TEİAŞ ŞEBEKE TESİS 5. GRUP MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	15D030420	ENERJİ	Yeniçates-Çaycuma2- Safranbolu-Karabük EİH Yenileme	MERKEZ	2015-2018	24.000,00	13.800,00	15.200,00	15.200,00	100	99
2	15D030410	ENERJİ	Yeniçates- Bartın EİH Yenileme	MERKEZ	2015-2018	14.500,00	2,00	10.881,00	10.881,00	100	75
3	18D002940	ENERJİ	Alaplı Ereğli OSB TM	ALAPLI	2018-2020	12.000,00	0,00	2,00	0,00	0	0
4	17D000230	ENERJİ	380 Bartın Akçakoca EİH	MERKEZ	2017-2021	107.500,00	50,00	15.000,00	0,00	0	0
TOPLAM						158.000,00	13.852,00	41.083,00	26.081,00	63	44

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	2017K010650	DKH	TÜİK Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası	MERKEZ	2017-2018	6.256,00	484,00	5.662,00	5.662,00	100	80
2	2017K090510	DKH	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı	MERKEZ	2018-2019	8.946,00	3.852,00	4.351,00	4.351,00	100	60
3		DKH	Devrek 300 Kişilik Yurt Binası İnşaatı İlk Kısmanıda Yapılmış Olan Kusurlu OG	DEVREK	2018-2018	103,00	0,00	102,00	102,00	100	100
4	200K171660	DKH	Sosyal Hizmet Merkezi Ve İl Müdürlüğü Binası	MERKEZ	2014-2019	10.775,00	10.472,00	88,00	88,00	100	100
5	2011K090030	DKH	Tapu Kadastro İl Müdürlüğü Hizmet Binası	MERKEZ	2018-2020	12.557,00	0,00	12.598,00	0,00	0	0
TOPLAM						38.637,00	14.808,00	22.801,00	10.203,00	45	68

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1		EĞİTİM	Çaycuma Anaokulu	ÇAYCUMA	2017-2019	2.228,00	0,00	450,00	929,00	206	100
2		EĞİTİM	Ereğli Anaokulu	KDZ.EREĞLİ	2017-2019	2.228,00	0,00	450,00	966,00	215	35
3		EĞİTİM	Özel Eğitim Ana Sınıfı ve Özel Eğitim 2. Kademe Okul Projesi	MERKEZ	2016-2018	6.411,00	777,00	5.945,00	5.563,00	94	85
4		EĞİTİM	Alaplı Karşıyaka İlkokulu	ALAPLI	2018-2019	4.453,00	0,00	1.390,00	0,00	0	0
5		EĞİTİM	Ereğli İhsan YILMAZ İlkokulu	KDZ.EREĞLİ	2018-2020	5.607,00	0,00	1.621,00	0,00	0	0
6		EĞİTİM	Devrek Karşıyaka 100. Yıl ilkokulu	DEVREK	2018-2019	1.227,00	0,00	745,00	0,00	0	0
7		EĞİTİM	Kepez İlkokulu	KDZ.EREĞLİ	2017-2019	8.808,00	0,00	1.761,00	1.840,00	104	27
8		EĞİTİM	Erdemir İlkokulu	KDZ.EREĞLİ	2017-2019	8.808,00	0,00	1.761,00	2.975,00	169	44
9		EĞİTİM	İzmirlioğlu İlkokulu	KDZ.EREĞLİ	2017-2019	6.256,00	0,00	1.251,00	0,00	0	0
10		EĞİTİM	Aşağıdağ İlkokulu	ALAPLI	2017-2019	3.463,00	0,00	692,00	0,00	0	0
11		EĞİTİM	Kozlu Kocatepe 24 Derslikli İlkokulu	KOZLU	2017-2019	8.808,00	0,00	1.761,00	0,00	0	0
12		EĞİTİM	Ereğli Gülüç Vesile DİKMEN İlkokulu	KDZ.EREĞLİ	2017-2019	8.808,00	0,00	1.761,00	0,00	0	0
13		EĞİTİM	Gazi Ortaokulu	MERKEZ	2017-2019	8.808,00	0,00	1.761,00	1.554,00	88	25
14		EĞİTİM	Cumhuriyet Ortaokulu	KDZ.EREĞLİ	2017-2019	8.808,00	0,00	1.761,00	2.142,00	122	40
15		EĞİTİM	Gökçebey Ortaokulu	GÖKÇEBEY	2017-2019	6.256,00	0,00	1.973,00	0,00	0	0
16		EĞİTİM	Ereğli Merih ŞULE Ortaokulu	KDZ.EREĞLİ	2015-2018	4.791,00	2.697,00	3.925,00	2.379,00	61	100
17		EĞİTİM	Alaplı İHO	ALAPLI	2017-2019	6.256,00	0,00	1.251,00	0,00	0	0
18		EĞİTİM	Devrek İHO	DEVREK	2015-2018	4.930,00	5.359,00	1.036,00	345,00	33	100
19		EĞİTİM	Çaycuma İHO	ÇAYCUMA	2015-2019	6.500,00	0,00	3.250,00	4.386,00	135	56

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
20		EĞİTİM	Kilimli İHO	KİLİMLİ	2015-2018	4.568,00	2.389,00	3.303,00	2.831,00	86	100
21		EĞİTİM	Merkez İHL Kız Öğrenci Pansiyonu	MERKEZ	2015-2018	7.000,00	0,00	2.450,00	0,00	0	0
22		EĞİTİM	Alaplı İHL ve Pansiyonu İnşaatı	ALAPLI	2017-2018	9.472,00	9.320,00	119,00	0,00	0	100
23		EĞİTİM	Çaycuma Mesleki ve Teknik Lisesi Yapımı(24 Derslik)	ÇAYCUMA	2018-2019	7.600,00	0,00	2.500,00	0,00	0	0
24		EĞİTİM	Ereğli Anadolu Lisesi İnşaatı	KDZ.EREĞLİ	2018-2019	9.120,00	0,00	2.419,00	3.235,00	134	63
25		EĞİTİM	Devrek İHL 24 Derslik	DEVREK	2016-2019	22.000,00	5.765,00	13.689,00	16.563,00	121	99
26		EĞİTİM	Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Lisesi(16 Derslik)	MERKEZ	2017-2019	7.500,00	0,00	750,00	0,00	0	0
27		EĞİTİM	Alaplı Halk Eğitim Merkezi(12 Derslik)	ALAPLI	2017-2019	5.500,00	0,00	550,00	0,00	0	0
28		EĞİTİM	Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi	KDZ.EREĞLİ	2017-2019	9.000,00	0,00	664,00	1.818,00	274	25
29		EĞİTİM	Kilimli Ortaöğretim Pansiyonu Spor Lisesi (200 Öğrenci)	KİLİMLİ	2017-2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0	0
TOPLAM						203.214,00	26.307,00	68.989,00	47.526,00	69	34

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1		SAĞLIK	Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı	MERKEZ	2018-2020	106.729,00	0,00	41.000,00	40.969,00	100	25
2		SAĞLIK	Gökçebey 10 Hasta Odalı(20 Yataklı) 111 ASHİ	GÖKÇEBEY	2017-2019	10.968,00	962,00	10.000,00	9.752,00	98	95
3		SAĞLIK	Nebioğlu 2-3 Hekimlik ASM	ÇAYCUMA	2017-2018	647,00	0,00	647,00	647,00	100	100
4		SAĞLIK	Network Ağı Yapımı	MERKEZ	2018-2018	55,00	0,00	65,00	65,00	100	100
5		SAĞLIK	Çaycuma 112 ASH Yapımı	ÇAYCUMA	2018-2019	412,00	0,00	412,00	194,00	47	60
6		SAĞLIK	Çaycuma 112 ASH Yapımı	DEVREK	2018-2018	598,00	0,00	598,00	198,00	33	100
7		SAĞLIK	Beycuma 3+4 Birimlik ASM ve 112 ASH Yapımı	MERKEZ	2018-2018	1.098,00	0,00	1.098,00	379,00	35	35
8		SAĞLIK	Atatürk Devlet Hastanesi Ana Bina ve Ek Binaların Doğalgaz Dönüşümü	MERKEZ	2018-2018	2.236,00	0,00	2.236,00	1.882,00	84	100
9		SAĞLIK	İl Sağlık Müdürlüğü Acılık Ek Binası Doğalgaz Dönüşümü	MERKEZ	2018-2018	135,00	0,00	150,00	135,00	90	100
TOPLAM						122.878,00	962,00	56.206,00	54.221,00	96	79

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1		ULAŞTIRMA	Eceler K.Y. 1. Kat asfalt (3 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL İDARE)	MERKEZ	2018-2018	367,00	0,00	367,00	367,00	100	100
2		ULAŞTIRMA	Kabalaklı K.Y. 1. Kat asfalt (1 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL İDARE)	MERKEZ	2018-2018	122,00	0,00	122,00	122,00	100	100
3		ULAŞTIRMA	Keller K. Çavuşlar Mh.Y. 1. Kat asfalt (1 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL	MERKEZ	2018-2018	122,00	0,00	122,00	122,00	100	100
4		ULAŞTIRMA	Alancık K. Merkez Mh.Y. 1. Kat asfalt (2 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL	MERKEZ	2018-2018	244,00	0,00	244,00	244,00	100	100
5		ULAŞTIRMA	Alancık K. Marıkpınarı Mh.Y. 2. Kat asfalt (2 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	MERKEZ	2018-2018	244,00	0,00	244,00	244,00	100	100
6		ULAŞTIRMA	Sarımsak K. Olukyanı K. Y. 2. Kat asfalt (1,5 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	MERKEZ	2018-2018	183,00	0,00	183,00	183,00	100	100
7		ULAŞTIRMA	Karadere K.Y. 2. Kat Asfalt (3 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL İDARE)	MERKEZ	2018-2018	367,00	0,00	367,00	367,00	100	100
8		ULAŞTIRMA	Dağköy-Ebegümeci K.-Dağlıca K.bağ.Y. 1. Kat Asfalt (5 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT	KOZLU	2018-2018	611,00	0,00	611,00	611,00	100	100
9		ULAŞTIRMA	İly.İlt.Saka K.-Çengelli Bağ.Y. 1. Kat Asfalt (2 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	KOZLU	2018-2018	244,00	0,00	244,00	244,00	100	100
10		ULAŞTIRMA	Aşağıçayır K.-Uzungüney bağ.Y. 1. Kat Asfalt (1,5 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT	KOZLU	2018-2018	183,00	0,00	183,00	183,00	100	100
11		ULAŞTIRMA	Ense K.-Soğalıçay Mah.Y. 1. Kat Asfalt (0,5 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	KOZLU	2018-2018	61,00	0,00	61,00	61,00	100	100
12		ULAŞTIRMA	Dereköy-Arabancı Bağ.Y. 1. Kat Asfalt (1 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL	KOZLU	2018-2018	122,00	0,00	122,00	122,00	100	100
13		ULAŞTIRMA	Kozlu Bld. Snr. İhasaniye Mh. Y. 1. Kat Asfalt (1 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	KOZLU	2018-2018	122,00	0,00	122,00	122,00	100	100
14		ULAŞTIRMA	Cambazlı K.-Hasanlı K. Y. 1. Kat Asfalt (1 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL	ALAPLI	2018-2018	122,00	0,00	122,00	122,00	100	100
15		ULAŞTIRMA	Yedigelli K.Y. (Çiftlik Mevkii) 1. Kat Asfalt (1,2 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	ALAPLI	2018-2018	147,00	0,00	147,00	147,00	100	100
16		ULAŞTIRMA	Onurlu K.Y. 1. Kat Asfalt (1 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL İDARE)	ALAPLI	2018-2018	122,00	0,00	122,00	122,00	100	100
17		ULAŞTIRMA	Yenidoğanlar K.Ömerli K.Y. 2. Kat Asfalt (3,3 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	ALAPLI	2018-2018	403,00	0,00	403,00	403,00	100	100
18		ULAŞTIRMA	Yeşilköy K.-Yeşilyayla Mah.Y. 1. Kat Asfalt (2,4 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT	ÇAYCUMA	2018-2018	293,00	0,00	293,00	293,00	100	100
19		ULAŞTIRMA	Aş.İhsaniye K.Y. 1. Kat Asfalt (1,2 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL İDARE)	ÇAYCUMA	2018-2018	147,00	0,00	147,00	147,00	100	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
20		ULAŞTIRMA	İhsanoğlu K. Eysanlar Mh.Y. 1. Kat Asfalt (2,1 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	ÇAYCUMA	2018-2018	257,00	0,00	257,00	257,00	100	100
21		ULAŞTIRMA	Hacılar K.Y. 1. Kat Asfalt (1,7 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL İDARE)	ÇAYCUMA	2018-2018	208,00	0,00	208,00	208,00	100	100
22		ULAŞTIRMA	Gökçetabaklar K.-:Helimler Mh.Y. 1. Kat Asfalt (3,1 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT	ÇAYCUMA	2018-2018	379,00	0,00	379,00	379,00	100	100
23		ULAŞTIRMA	Hacıosmanlar K. Akçalar Mh.Y. 1. Kat Asfalt (2 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	ÇAYCUMA	2018-2018	244,00	0,00	244,00	244,00	100	100
24		ULAŞTIRMA	Dursunlar K. İçi Y. 1. Kat Asfalt (2 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL İDARE)	ÇAYCUMA	2018-2018	244,00	0,00	244,00	244,00	100	100
25		ULAŞTIRMA	Kayabaşı K. Halaşlı-Günyüzü Mh.Y. 1. Kat Asfalt (3 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT	ÇAYCUMA	2018-2018	367,00	0,00	367,00	367,00	100	100
26		ULAŞTIRMA	Güdüllü K.-Çayır K. Y. 1. Kat Asfalt (5,7 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL	ÇAYCUMA	2018-2018	697,00	0,00	697,00	697,00	100	100
27		ULAŞTIRMA	Başaran K. İçi Y. 1. Kat Asfalt (2 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL İDARE)	ÇAYCUMA	2018-2018	244,00	0,00	244,00	244,00	100	100
28		ULAŞTIRMA	Kahvecioğlu K. Kirazoğlu Mh.-Karapınar Bld. Bağ.Y. 1. Kat Asfalt (1,8 Km)(KÖY YOLLARI	ÇAYCUMA	2018-2018	220,00	0,00	220,00	220,00	100	100
29		ULAŞTIRMA	Helvacılar K. Hasanbetyler Mah.Y. 1. Kat Asfalt (2 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT	ÇAYCUMA	2018-2018	244,00	0,00	244,00	244,00	100	100
30		ULAŞTIRMA	Çayırlı K.-Çatalcam Mh.Y. 1. Kat Asfalt (0,6 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	73,00	0,00	73,00	73,00	100	100
31		ULAŞTIRMA	Çölemen K.Yenidoğancılar K.Y. 1. Kat Asfalt (2 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	244,00	0,00	244,00	244,00	100	100
32		ULAŞTIRMA	İmranlar K.İçi Y. 1. Kat Asfalt (0,7 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	86,00	0,00	86,00	86,00	100	100
33		ULAŞTIRMA	Velidağ K.-Çaylıoğlu Bağ.Y. 1. Kat Asfalt (3,5 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	428,00	0,00	428,00	428,00	100	100
34		ULAŞTIRMA	Uludağ K. Merkez Mah. Y. 1. Kat Asfalt (3,7 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	452,00	0,00	452,00	452,00	100	100
35		ULAŞTIRMA	Karacakaya (B.ören) K.Y. 1. Kat Asfalt (1 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	122,00	0,00	122,00	122,00	100	100
36		ULAŞTIRMA	B.Ören K.-Obruk Mh.Y. 1. Kat Asfalt (3 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	367,00	0,00	367,00	367,00	100	100
37		ULAŞTIRMA	Esenköy K. Kozlu ilçe Snr.Y. 1. Kat Asfalt (4,5 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA -	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	550,00	0,00	550,00	550,00	100	100
38		ULAŞTIRMA	Esenler K. İçi Y. 1. Kat Asfalt (0,4 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	49,00	0,00	49,00	49,00	100	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
39		ULAŞTIRMA	Sağanlıyörük. K.-Delihakkı K.Y. 1. Kat Asfalt (1,5 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	183,00	0,00	183,00	183,00	100	100
40		ULAŞTIRMA	Kızılcapınar K.-Ramazanlı K.-Asarlı K.Y. 2. Kat Asfalt (8 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	978,00	0,00	978,00	978,00	100	100
41		ULAŞTIRMA	Bakiler-Etçioğlu Mh.Y. 2. Kat Asfalt (0,7 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT KAPLAMA - ÖZEL	GÖKÇEBEY	2018-2018	86,00	0,00	86,00	86,00	100	100
42		ULAŞTIRMA	Bakiler-Abasızoğlu-Tepeköy-Alibeyoğlu Mh.Y. 2. Kat Asfalt (1 Km)(KÖY YOLLARI	GÖKÇEBEY	2018-2018	122,00	0,00	122,00	122,00	100	100
43		ULAŞTIRMA	Dlt.y.İlt. Dağköy Y. Sıcak Asfalt (0,4 Km) (KÖY YOLLARI SICAK ASFALT KAPLAMA -	KOZLU	2018-2018	79,00	0,00	79,00	76,00	96	100
44		ULAŞTIRMA	Kurtköy K.-Yeniköy K. Y. Sıcak Asfalt (2 Km)(KÖY YOLLARI SICAK ASFALT	KİLİMLİ	2018-2018	474,00	0,00	474,00	457,00	96	100
45		ULAŞTIRMA	Gaziler K. Karanlıkoğlu Mh.Y. Sıcak Asfalt (0,45 Km)(KÖY YOLLARI SICAK ASFALT	GÖKÇEBEY	2018-2018	90,00	0,00	90,00	87,00	97	100
46		ULAŞTIRMA	Örmeci K.Y. Sıcak Asfalt (0,3 Km)(KÖY YOLLARI SICAK ASFALT KAPLAMA - ÖZEL	GÖKÇEBEY	2018-2018	60,00	0,00	60,00	58,00	97	100
47		ULAŞTIRMA	Merkez İlçe Zonguldak Belediye Sınırı İltisak Köroğlu Köyü - Sapça Köyü – Devlet Yolu	MERKEZ	2018-2018	289,00	0,00	289,00	289,00	100	100
48		ULAŞTIRMA	Merkez İlçe Beycuma Belediye Sınırı İltisak Asmacı Mahallesi - Yeşildere Mahallesi -	MERKEZ	2018-2018	558,00	0,00	558,00	558,00	100	100
49		ULAŞTIRMA	Merkez İlçe Zonguldak Belediye Sınırı İltisak Kokaksu Mahallesi Kardeşler Köyü - Yayla	MERKEZ	2018-2018	570,00	0,00	570,00	570,00	100	100
50		ULAŞTIRMA	Alaplı İlçesi Alaplı Belediyesi İltisak Mollabey Köyü-Aşağıdağköy Köyü-Dere Mahallesi-	ALAPLI	2018-2018	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	0	1
51		ULAŞTIRMA	Çaycuma İlçesi Çaycuma Belediye Sınırı İltisak Şahnalar Mahallesi - Müyesserler	ÇAYCUMA	2018-2018	3.381,00	0,00	3.381,00	3.381,00	100	100
52		ULAŞTIRMA	Devlet Yolu İltisak Çay Mahallesi - Erenköy Yeni Mahallesi - Çaycuma Belediye Sınır Yolu	ÇAYCUMA	2018-2018	385,00	0,00	385,00	0,00	0	1
53		ULAŞTIRMA	Devrek İlçesi Grup Yolu İltisak Özbağı Köyü - Madencioğlu Köyü - Derebuluca Köyü -	DEVREK	2018-2018	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	100	100
54		ULAŞTIRMA	Devrek İlçesi Devrek Belediye Sınırı İltisak Gürçeşme Köyü - Türedioğlu Mahallesi -	DEVREK	2018-2018	936,00	0,00	936,00	0,00	0	1
55		ULAŞTIRMA	Devrek İlçesi Yılancakuz Köyü - Tabaklar Köyü - Velibeyler Köyü - Çağlar Köyü -	DEVREK	2018-2018	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0	1
56		ULAŞTIRMA	Ereğli İlçesi Ereğli Belediye Sınırı İltisak Ketenciler Köyü - Kahyalar Mahallesi -	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	298,00	0,00	298,00	0,00	0	1
57		ULAŞTIRMA	Ereğli İlçesi İlyolu İltisak Asarlı Köyü-Külah Köyü-Kasımlı Mahallesi-Çavuşlar Mahallesi-	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	0	1

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
58		ULAŞTIRMA	Ereğli İlçesi İlyolu İltisak Çiğdemli Köyü-AlaplıSofular Köyü- Emirali Köyü-Danışmentli	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00	0	1
59		ULAŞTIRMA	Gökçebey İlçesi Belediye İltisak Hacımusa Köyü - Pazarlıoğlu Köyü - Dağdemirciler	GÖKÇEBEY	2018-2018	947,00	0,00	947,00	947,00	100	100
60		ULAŞTIRMA	Kozlu İlçesi İl Devlet Yolu İltisak Kızılcakese Köyü - Aşağıçayır Köyü - Balçıklı Köyü -	KOZLU	2018-2018	940,00	0,00	940,00	940,00	100	100
61		ULAŞTIRMA	Kilimli İlçesi İl Yolu İltisak Göbü Köyü - Oruçlar Mahallesi - Şirinköy Köyü - Kurtköy	KİLİMLİ	2018-2018	299,00	0,00	299,00	299,00	100	100
62		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 2678 ton(KÖY YOLLARINDA ASFALT YAMA-ÖZEL İDARE)	MERKEZ	2018-2018	463,00	0,00	463,00	457,00	99	100
63		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 952 ton(KÖY YOLLARINDA ASFALT YAMA-ÖZEL İDARE)	KOZLU	2018-2018	164,00	0,00	164,00	162,00	99	100
64		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 5196 ton(KÖY YOLLARINDA ASFALT YAMA-ÖZEL İDARE)	ALAPLI	2018-2018	899,00	0,00	899,00	887,00	99	100
65		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 471 ton(KÖY YOLLARINDA ASFALT YAMA-ÖZEL İDARE)	ÇAYCUMA	2018-2018	81,00	0,00	81,00	80,00	99	100
66		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 10121 ton(KÖY YOLLARINDA ASFALT YAMA-ÖZEL İDARE)	DEVREK	2018-2018	1.766,00	0,00	1.766,00	1.742,00	99	100
67		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 4048 ton(KÖY YOLLARINDA ASFALT YAMA-ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	701,00	0,00	701,00	691,00	99	100
68		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 714 ton(KÖY YOLLARINDA ASFALT YAMA-ÖZEL İDARE)	GÖKÇEBEY	2018-2018	124,00	0,00	124,00	122,00	98	100
69		ULAŞTIRMA	Stabilize Yol Bakımı 8,5 km (KÖY YOLLARI STABİLİZE YAPIMI ÖZEL İDARE)	MERKEZ	2018-2018	138,00	0,00	138,00	137,00	99	100
70		ULAŞTIRMA	Stabilize Yol Bakımı 9 km (KÖY YOLLARI STABİLİZE YAPIMI ÖZEL İDARE)	KOZLU	2018-2018	146,00	0,00	146,00	145,00	99	100
71		ULAŞTIRMA	Stabilize Yol Bakımı 3,5 km (KÖY YOLLARI STABİLİZE YAPIMI ÖZEL İDARE)	ALAPLI	2018-2018	57,00	0,00	57,00	56,00	98	100
72		ULAŞTIRMA	Stabilize Yol Bakımı 2 km (KÖY YOLLARI STABİLİZE YAPIMI ÖZEL İDARE)	ÇAYCUMA	2018-2018	32,00	0,00	32,00	32,00	100	100
73		ULAŞTIRMA	Stabilize Yol Bakımı 10 km (KÖY YOLLARI STABİLİZE YAPIMI ÖZEL İDARE)	DEVREK	2018-2018	163,00	0,00	163,00	161,00	99	100
74		ULAŞTIRMA	Stabilize Yol Bakımı 14,3 km (KÖY YOLLARI STABİLİZE YAPIMI ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	233,00	0,00	233,00	230,00	99	100
75		ULAŞTIRMA	Yol Bakım Onarımı 8,5 km(KÖY YOLLARI ONARIMI ÖZEL İDARE)	MERKEZ	2018-2018	302,00	0,00	302,00	299,00	99	100
76		ULAŞTIRMA	Yol Bakım Onarımı 9 km(KÖY YOLLARI ONARIMI ÖZEL İDARE)	KOZLU	2018-2018	320,00	0,00	320,00	317,00	99	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
77		ULAŞTIRMA	Yol Bakım Onarımı 3,5 km(KÖY YOLLARI ONARIMI ÖZEL İDARE)	ALAPLI	2018-2018	125,00	0,00	125,00	123,00	98	100
78		ULAŞTIRMA	Yol Bakım Onarımı 2 km(KÖY YOLLARI ONARIMI ÖZEL İDARE)	ÇAYCUMA	2018-2018	71,00	0,00	71,00	70,00	99	100
79		ULAŞTIRMA	Yol Bakım Onarımı 10 km(KÖY YOLLARI ONARIMI ÖZEL İDARE)	DEVREK	2018-2018	356,00	0,00	356,00	352,00	99	100
80		ULAŞTIRMA	Yol Bakım Onarımı 12 km(KÖY YOLLARI ONARIMI ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	427,00	0,00	427,00	423,00	99	100
81		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Malzemeli Bakım 100 km(ÖZEL İDARE)	MERKEZ	2018-2018	566,00	0,00	566,00	560,00	99	100
82		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Malzemeli Bakım 10 km(ÖZEL İDARE)	KİLİMLİ	2018-2018	56,00	0,00	56,00	56,00	100	100
83		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Malzemeli Bakım 100 km(ÖZEL İDARE)	KOZLU	2018-2018	566,00	0,00	566,00	560,00	99	100
84		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Malzemeli Bakım 120 km(ÖZEL İDARE)	ALAPLI	2018-2018	679,00	0,00	679,00	672,00	99	100
85		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Malzemeli Bakım 240 km(ÖZEL İDARE)	ÇAYCUMA	2018-2018	1.358,00	0,00	1.358,00	1.344,00	99	100
86		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Malzemeli Bakım 270 km(ÖZEL İDARE)	DEVREK	2018-2018	1.528,00	0,00	1.528,00	1.513,00	99	100
87		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Malzemeli Bakım 250 km(ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	1.415,00	0,00	1.415,00	1.401,00	99	100
88		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Malzemeli Bakım 25 km(ÖZEL İDARE)	GÖKÇEBEY	2018-2018	141,00	0,00	141,00	140,00	99	100
89		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Greyderli Bakım 100 km(ÖZEL İDARE)	MERKEZ	2018-2018	111,00	0,00	111,00	110,00	99	100
90		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Greyderli Bakım 10 km(ÖZEL İDARE)	KİLİMLİ	2018-2018	11,00	0,00	11,00	11,00	100	100
91		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Greyderli Bakım 100 km(ÖZEL İDARE)	KOZLU	2018-2018	111,00	0,00	111,00	110,00	99	100
92		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Greyderli Bakım 120 km(ÖZEL İDARE)	ALAPLI	2018-2018	133,00	0,00	133,00	132,00	99	100
93		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Greyderli Bakım 240 km(ÖZEL İDARE)	ÇAYCUMA	2018-2018	266,00	0,00	266,00	263,00	99	100
94		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Greyderli Bakım 270 km(ÖZEL İDARE)	DEVREK	2018-2018	299,00	0,00	299,00	296,00	99	100
95		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Greyderli Bakım 250 km(ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	277,00	0,00	277,00	274,00	99	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
96		ULAŞTIRMA	Köy Yollarında Greyderli Bakım 25 km(ÖZEL İDARE)	GÖKÇEBEY	2018-2018	28,00	0,00	28,00	27,00	96	100
97		ULAŞTIRMA	Aydın K.-Öğberler K.Y. Asfalt Temel Haz. (0,8 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT TEMEL	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	50,00	0,00	50,00	48,00	96	100
97		DKH	Hacımusa Köyü İçme suyu İnşaatı(YENİ İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ)(ÖZEL İDARE)	GÖKÇEBEY	2018-2019	620,00	0,00	300,00	300,00	100	98
99		ULAŞTIRMA	Karakavuz K.-Tepeköy K. Y. Asfalt Temel Haz. (3 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT TEMEL	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	150,00	0,00	150,00	144,00	96	100
100		ULAŞTIRMA	Yazıören K.-Yk.Hocalar K.Y. Asfalt Temel Haz. (1 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT TEMEL	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	50,00	0,00	50,00	48,00	96	100
101		ULAŞTIRMA	Tepeören K. Sahil Y. Asfalt Temel Haz. (1,5 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT TEMEL	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	65,00	0,00	65,00	63,00	97	100
102		ULAŞTIRMA	Tepeören K. Çalça K.Y. Asfalt Temel Haz. (3 Km)(KÖY YOLLARI ASFALT TEMEL	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	130,00	0,00	130,00	125,00	96	100
103		DKH	Muhsinler Sivriovaz İçm+Kanal. İnş.(YENİ İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ)(ÖZEL İDARE)	GÖKÇEBEY	2018-2019	116,00	0,00	123,00	124,00	101	100
104		DKH	Merkeze Bağlı Muhtelif Köylere Terfi Binası Yapımı(ÖZEL İDARE)	MERKEZ	2018-2018	84,00	0,00	84,00	51,00	61	100
105		DKH	Seyisoğlu Köyü İçme suyu+ ENH İnşaatı(YENİ İHALELİ İÇMESUYU	DEVREK	2018-2019	344,00	0,00	280,00	268,00	96	100
106		DKH	Yağmurca Köyü İçme suyu+ ENH İnşaatı(YENİ İHALELİ İÇMESUYU	DEVREK	2018-2019	89,00	0,00	89,00	89,00	100	100
107		DKH	İsabeyli Köyü İçme suyu İnşaatı(YENİ İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ)(ÖZEL İDARE)	DEVREK	2018-2019	341,00	0,00	80,00	80,00	100	10
108		DKH	Dedeoğlu Köyü İçme suyu İnşaatı(YENİ İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ)(ÖZEL İDARE)	DEVREK	2018-2018	113,00	0,00	150,00	105,00	70	100
109		DKH	Ahmetoğlu Köyü İçme suyu+ ENH İnşaatı(YENİ İHALELİ İÇMESUYU	DEVREK	2018-2019	801,00	0,00	300,00	231,00	77	80
110		DKH	Üçköy Köyü ENH Yenileme İnşaatı(YENİ İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ)(ÖZEL İDARE)	KOZLU	2018-2019	0,00	0,00	40,00	0,00	0	0
111		DKH	Hacıosmanlar Köyü İçme suyu İnşaatı(DEVAM EDEN İHALELİ İÇMESUYU	KDZ.EREĞLİ	2017-2018	165,00	100,00	95,00	81,00	85	100
112		DKH	Yenidoğancılar Köyü(Çöremen Mah.) İçme suyu İnşaatı(DEVAM EDEN İHALELİ	KDZ.EREĞLİ	2017-2018	304,00	100,00	240,00	214,00	89	100
113		DKH	Vakıf Köyü İçme suyu İnşaatı(DEVAM EDEN İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ)(ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2017-2018	291,00	81,00	223,00	187,00	84	100
114		DKH	Ortaköy Köyü İçme suyu İnşaatı(DEVAM EDEN İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ)(ÖZEL	KDZ.EREĞLİ	2017-2018	167,00	100,00	95,00	51,00	54	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
115		DKH	Balçıklı-Ormanlı Köyü İçme suyu İnşaatı(DEVAM EDEN İHALELİ İÇMESUYU	KOZLU	2018-2018	296,00	124,00	181,00	181,00	100	100
116		DKH	Zonguldak Devlet Hastanesine Bağlı Tescilli Olan Site Ek Binasının Onarımı - KUDEP	MERKEZ	2018-2019	167,00	0,00	177,00	142,00	80	95
117		DKH	Devrek Baston Müzesi Tefrişat ve Güvenlik Ekipmanları Alımı(ÖZEL İDARE)	DEVREK	2018-2019	1.079,00	0,00	739,00	139,00	19	70
118		DKH	Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı Yapımı(ÖZEL İDARE)	DEVREK	2017-2019	3.498,00	1.525,00	1.904,00	1.904,00	100	95
119		DKH	Manolya Park(ÖZEL İDARE)	MERKEZ	2017-2018	2.545,00	1.848,00	696,00	566,00	81	100
120		DKH	Gökçebey Hükümet Konağı Doğalgaz Dönüşümü(ÖZEL İDARE)	GÖKÇEBEY	2018-2018	133,00	0,00	154,00	121,00	79	100
121		DKH	Zonguldak Hükümet Konağı Elektrik Tes. Onarımı(ÖZEL İDARE)	MERKEZ	2018-2019	120,00	0,00	120,00	0,00	0	80
122		DKH	Gayrimenkul Mal Alım Bakım ve Onarım Gideri(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	616,00	0,00	616,00	616,00	100	100
123		DKH	Şehit Mezarları yapım, bakım onarımları(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	275,00	0,00	275,00	128,00	47	100
124		DKH	Köye Yönelik Altyapı Yatırımları (Süleymanbeyler Hayvan Pazarı Çelik	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	381,00	0,00	381,00	381,00	100	100
125		ULAŞTIRMA	BEYCUMA Bld.sın İlt.Asmacı mh.- Yeşildere Mh.- KARAPINAR k.- SARAYCIK k.-	MERKEZ	2018-2018	715,00	0,00	715,00	715,00	100	100
126		ULAŞTIRMA	Mevcut Asfalt Plentleri Bakım ve Onarım(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	332,00	0,00	332,00	327,00	98	100
127		DKH	Gökçebey İlçesi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi	GÖKÇEBEY	2017-2019	167,00	0,00	280,00	107,00	38	70
128		ULAŞTIRMA	ZONGULDAK Bld sın.İlt.Kokaksu Mh.KARDEŞLER k.-Yayla Mh. HACIALİ k.-	MERKEZ	2018-2018	919,00	0,00	919,00	919,00	100	100
129		DKH	Kanalizasyon Borusu Alımı(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	398,00	0,00	398,00	398,00	100	100
130		ULAŞTIRMA	Dy.İlt.ÇUKURÖREN k.- KORUCAK k.- BEYCUMA bld.bağ. (1,5 Km.)(KÖY YOLLARI	MERKEZ	2018-2018	479,00	0,00	479,00	479,00	100	100
131		DKH	Çöp Konteyneri Alımı(Gökçebey İlçesi Köyleri)(ÖZEL İDARE)	GÖKÇEBEY	2018-2018	30,00	0,00	30,00	26,00	87	100
132		ULAŞTIRMA	Grp.Y.İlt.Peyenli Mh. Yukarı Göynük Köyü Esenyurt Köyü Kilimli İlçe Snr. Bağ.Yolu (3	ÇAYCUMA	2018-2018	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	100	100
133		DKH	Su isale hatlarının kireçlenmesinin önlenmesi(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	24,00	0,00	24,00	24,00	100	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

Bin TL

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
134		DKH	İçmesuyu Kontrol ve Denetleme İzlemesi Analiz Çalışmaları(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	158,00	0,00	158,00	150,00	95	100
135		ULAŞTIRMA	İl.y.İlt.Göbü K.-Oruçlar Mh.Şirinköy K.Kurtköy K.Yeniköy Mh.İlç.Snr. (1,5 Km.)(KÖY	KİLİMLİ	2018-2018	423,00	0,00	423,00	423,00	100	100
136		DKH	İçme Suları bakım ve onarım işleri(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	356,00	0,00	356,00	356,00	100	100
137		ULAŞTIRMA	Dy.İlt.KIZILCAKESE k. AŞ.ÇAYIR k.-BALÇIKLI k.- SİVRİLER k.- Manaşlar Mh.-	KOZLU	2018-2018	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	100	100
138		ULAŞTIRMA	ARMUTCUK Bld. sın. İlt. Kızılca Mh. - Cebeci Mh. - Ahmetler Mh. - MERKEZ İlçe bağ.y.	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	22,00	0,00	22,00	22,00	100	100
139		DKH	Otomatik Klorlama cihazı Temini(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	13,00	0,00	13,00	13,00	100	100
140		ULAŞTIRMA	Grp.Y.İlt. Yukarı Dere K. Kışla K. Kırıklar Mh. Göçler Mh. Çayır K. Güdüllü K. Güzelyaka K.	ÇAYCUMA	2018-2018	1.543,00	0,00	1.543,00	1.543,00	100	100
141		DKH	İçmesuyu Borusu Alımı(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	872,00	0,00	872,00	872,00	100	100
142		ULAŞTIRMA	Alaplı bld.ilt.Mollabey k.-Aş.Dağ k.-Dere Mh.-Gümeli bld.sın. (2,5 Km.)(KÖY YOLLARI BSK	ALAPLI	2018-2018	990,00	0,00	990,00	990,00	100	100
143		DKH	Kdz.Ereğli Böl.Komutanlığı İçmesuyu İnşaatı(ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	109,00	0,00	150,00	150,00	100	100
144		ULAŞTIRMA	Dy.İlt. Kayıkçılar K.Hacıoğlu Mh. Cinağa Mh. Arıcıoğlu Mh. Dy.Bağ (2,7 Km.)(KÖY	ÇAYCUMA	2018-2018	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	100	100
145		DKH	Zonguldak Belediyesi Belediye Kültür Merkezi Onarımı (Sinema) - KUDEP	MERKEZ	2017-2019	500,00	0,00	603,00	240,00	40	50
146		ULAŞTIRMA	Dy.İlt. Dereköseler K. Köseler Mh. Grp.Y.Bağ. (4,8 Km.)(KÖY YOLLARI BSK	ÇAYCUMA	2018-2018	1.927,00	0,00	1.927,00	1.927,00	100	100
147		DKH	Sarnaz Köyü İçme suyu İnşaatı(DEVAM EDEN İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ)	DEVREK	2016-2018	194,00	150,00	85,00	56,00	66	100
148		ULAŞTIRMA	Gr.Y.İlt. Muhsinler K. Çakırlar Mh. Kamiloğlu Mh. Gemezli Mh. Yolu (5,8 Km.)(KÖY	ÇAYCUMA	2018-2018	2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00	100	100
149		ULAŞTIRMA	Evsel Katı Atık Depolanması(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	1.412,00	0,00	1.412,00	1.371,00	97	100
150		ULAŞTIRMA	Gry.İlt.ÖZBAĞI k.-MADENCİOĞLU K.-DEREBULUCA k.-EVEYİKLER k.-Alakazlar	DEVREK	2018-2018	2.118,00	0,00	2.188,00	2.188,00	100	100
151		ULAŞTIRMA	Devrek Bld.sın.İlt.GÜRÇEŞME k.-Türedioğlu Mh.-ÇOMAKLAR k.-KARAKOÇLU k.-Kadıoğlu	DEVREK	2018-2018	1.868,00	0,00	1.868,00	1.868,00	100	100
152		ULAŞTIRMA	Beton Yol Beton Kanal Yapımı(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	352,00	0,00	352,00	277,00	79	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
153		ULAŞTIRMA	Şirinköy İstinat Duvarı(ÖZEL İDARE)	KİLİMLİ	2018-2018	130,00	0,00	130,00	110,00	85	100
154		ULAŞTIRMA	İly.İlt.YILANCAKUZ k.-TABAKLAR k.-Malye Mh.-VELİBEYLER k.-Orna Mh.-ÇAĞLAR k.-	DEVREK	2018-2018	2.657,00	0,00	2.657,00	2.657,00	100	100
155		ULAŞTIRMA	Esenler-Zindancılar K.Y. Menfez Yapım İşi(ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	39,00	0,00	39,00	38,00	97	100
156		ULAŞTIRMA	EREĞLİ Bld.sın.İlt.KETENCİLER k.- Kahyalar Mh.- Cariyeli Mh.İly.bağ. (4,7 Km.)(KÖY	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	100	100
157		ULAŞTIRMA	Davutlar İstinat Duvarı(ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	70,00	0,00	70,00	69,00	99	100
158		ULAŞTIRMA	Dy. İlt. Uzunahmetler Mh. Devrek İlçesi Karabaşlı K. Bağ.(1,5 Km.)(KÖY YOLLARI	GÖKÇEBEY	2018-2018	569,00	0,00	569,00	569,00	100	100
159		ULAŞTIRMA	Ormanlı beton Yol İnş.(AFET PROGRAMI ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER ÖZEL İDARE)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	100	100
160		ULAŞTIRMA	Bakacakkadı Bld.İlt.Alibeyoğlu Mh. Bakioglu Mh.Etçioğlu Mh.Bekirbaşoğlu Mh. Çaycuma	GÖKÇEBEY	2018-2018	379,00	0,00	379,00	379,00	100	100
161		ULAŞTIRMA	Gürpınar K.Y Duvar Yapımı(AFET PROGRAMI ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER	ALAPLI	2018-2018	59,00	0,00	59,00	53,00	90	100
162		ULAŞTIRMA	Bld.İlt. Gaziler K.Cerrahoğlu Mh. Bodaç K.Y. (1 Km.)(KÖY YOLLARI BSK	GÖKÇEBEY	2018-2018	345,00	0,00	345,00	345,00	100	100
163		ULAŞTIRMA	030 KKN Mollabey-İsafakıllı K.Y Duvar Yapımı(AFET PROGRAMI ÖDENEĞİ İLE	ALAPLI	2018-2018	161,00	0,00	161,00	161,00	100	100
164		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 2500 ton(KÖYDES)	MERKEZ	2018-2018	342,00	0,00	342,00	342,00	100	100
165		ULAŞTIRMA	Sıcak Karışım(KÖYDES)	KİLİMLİ	2018-2018	49,00	0,00	49,00	49,00	100	100
166		ULAŞTIRMA	Çamcılar K.Y Duvar Yapımı(AFET PROGRAMI ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER	ALAPLI	2018-2018	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	0	0
167		ULAŞTIRMA	Sıcak Karışım(KÖYDES)	KOZLU	2018-2018	342,00	0,00	342,00	342,00	100	100
168		ULAŞTIRMA	Uzungüney Kargalar Köyyolu Duvar Yapımı(AFET PROGRAMI ÖDENEĞİ İLE	KOZLU	2018-2018	401,00	0,00	401,00	401,00	100	100
169		ULAŞTIRMA	Karadere Karapınar Köy Yolu Duvar Yapımı(AFET PROGRAMI ÖDENEĞİ İLE	MERKEZ	2018-2018	57,00	0,00	57,00	57,00	100	100
170		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 300 ton(KÖYDES)	KOZLU	2018-2018	41,00	0,00	41,00	41,00	100	100
171		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 3250 ton(KÖYDES)	ALAPLI	2018-2018	512,00	0,00	512,00	512,00	100	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
172		DKH	Muhtelif Köylere Depo Yapımı	MUHTELİF	2018-2018	263,00	0,00	263,00	206,00	78	100
173		ULAŞTIRMA	Bariyer-Korkuluk Yapımı(ÖZEL İDARE)	MUHTELİF	2018-2018	130,00	0,00	130,00	112,00	86	100
174		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 1625 ton(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2018-2018	223,00	0,00	223,00	223,00	100	100
175		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 7700 ton(KÖYDES)	DEVREK	2018-2018	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00	100	100
176		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 5000 ton(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	754,00	0,00	754,00	754,00	100	100
177		ULAŞTIRMA	Asfalt Yama 1000 ton(KÖYDES)	GÖKÇEBEY	2018-2018	137,00	0,00	137,00	137,00	100	100
178		ULAŞTIRMA	A.Sofular K.Y. İstinat Duvarı İnş.(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	80,00	0,00	80,00	80,00	100	100
179		ULAŞTIRMA	Çevlik K.Y. İstinat Duvarı İnş.(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	30,00	0,00	30,00	30,00	100	100
180		ULAŞTIRMA	Muhtelif Köyler Parke Alımı (7500 m²)(PARKE YOL YAPIMI)(KÖYDES)	KOZLU	2018-2018	150,00	0,00	150,00	150,00	100	100
181		ULAŞTIRMA	Muhtelif Köyler Parke Alımı (34000 m²)(PARKE YOL YAPIMI)(KÖYDES)	ALAPLI	2018-2018	432,00	0,00	432,00	432,00	100	100
182		ULAŞTIRMA	Muhtelif Köyler Parke Alımı (54650 m²)(PARKE YOL YAPIMI)(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2018-2018	900,00	0,00	900,00	900,00	100	100
183		DKH	Gücek Köyü İçmesuyu inş.(KÖYDES)	KOZLU	2018-2018	18,00	0,00	18,00	18,00	100	100
184		ULAŞTIRMA	Muhtelif Köyler Parke Alımı (50000 m²)(PARKE YOL YAPIMI)(KÖYDES)	DEVREK	2018-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100	100
185		ULAŞTIRMA	Muhtelif Köyler Parke Alımı (54372 m²)(PARKE YOL YAPIMI)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	100	100
186		DKH	Dağköy K. İçmesuyu onarım(KÖYDES)	KOZLU	2018-2018	35,00	0,00	35,00	35,00	100	100
187		ULAŞTIRMA	Muhtelif Köyler Parke Alımı (15625 m²)(PARKE YOL YAPIMI)(KÖYDES)	GÖKÇEBEY	2018-2018	250,00	0,00	250,00	250,00	100	100
188		DKH	Klorlama Cihazı Temini(KÖYDES)	ALAPLI	2018-2018	69,00	0,00	69,00	69,00	100	100
189		DKH	Kabalar K. Sondaj(KÖYDES)	ALAPLI	2018-2018	229,00	0,00	229,00	229,00	100	100
190		DKH	Klorlama Cihazı Temini(KÖYDES)	KOZLU	2018-2018	52,00	0,00	52,00	52,00	100	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
191		DKH	Onurlu Köyü sondaj(KÖYDES)	ALAPLI	2018-2018	257,00	0,00	257,00	257,00	100	100
192		ULAŞTIRMA	Fındıklı-Çömlekçi K.Y.İstinat Duvarı Yapımı(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	251,00	0,00	251,00	251,00	100	100
193		DKH	Çamlıbel-Okçular K. İçmesuyu İnş.(KÖYDES)	ALAPLI	2018-2018	52,00	0,00	52,00	52,00	100	100
194		DKH	Klorlama Cihazı Temini(KÖYDES)	MERKEZ	2018-2018	94,00	0,00	94,00	94,00	100	100
195		DKH	Mollabey-Karacallı-Düğmeciler İçmesuyu İnş.(KÖYDES)	ALAPLI	2018-2018	178,00	0,00	178,00	178,00	100	100
196		ULAŞTIRMA	Beton Kanal Yapımı (3,6 Km.)(KÖYDES)	MERKEZ	2018-2018	322,00	0,00	322,00	322,00	100	100
197		ULAŞTIRMA	Beton Kanal Yapımı (3,9 Km.)(KÖYDES)	ALAPLI	2018-2018	360,00	0,00	360,00	360,00	100	100
198		DKH	Alioğlu K.İçmesuyu Onarım(KÖYDES)	ALAPLI	2018-2018	33,00	0,00	33,00	33,00	100	100
199		ULAŞTIRMA	Yunuslu Köyü-Avcılar Mh.yoluna Muhtelif Ebatlarda Büz Alımı(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	3,00	0,00	3,00	3,00	100	100
200		DKH	İçmeuyu Bakım Onarım işleri(KÖYDES)	ALAPLI	2018-2018	120,00	0,00	120,00	120,00	100	100
201		ULAŞTIRMA	Gry. İlt. Aşağı Mh.-KARAKAVUZ k.-Kirazağılı Mh. y. İstinat Duvarı Yapımı(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	24,00	0,00	24,00	24,00	100	100
202		DKH	Klorlama Cihazı Temini(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2018-2018	169,00	0,00	169,00	169,00	100	100
203		DKH	Uluköy Köyü sondaj.(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2018-2018	40,00	0,00	40,00	40,00	100	100
204		ULAŞTIRMA	Üçköy Köyü K.Y İstinat Duvarı Yapımı(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	109,00	0,00	109,00	109,00	100	100
205		DKH	Çömlekci Köyü İçmesuyu İnş.(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2018-2018	107,00	0,00	107,00	87,00	81	100
206		ULAŞTIRMA	Kocabelen Mh.-Aydınlar K.Y İstinat Duvarı Yapımı(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	110,00	0,00	110,00	110,00	100	100
207		DKH	Sapça-Alibüyük K. Sondaj(İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ)(KÖYDES)	MERKEZ	2018-2018	207,00	0,00	207,00	207,00	100	100
208		DKH	Torlaklar Grb.İçmesuyu İnş.(KÖYDES)	ÇAYCUMA	2018-2018	273,00	0,00	273,00	273,00	100	100
209		DKH	Klorlama Cihazı Temini(KÖYDES)	DEVREK	2018-2018	93,00	0,00	93,00	93,00	100	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
210		DKH	Osmanlı-Ömeroğlu İçmesuyu İnş.(KÖYDES)	MERKEZ	2018-2018	82,00	0,00	82,00	82,00	100	100
211		DKH	Tabaklar-Yeniköy İçmesuyu İnş.(KÖYDES)	DEVREK	2018-2018	541,00	0,00	541,00	395,00	73	100
212		DKH	Alancık K. Tesis Bakım(KÖYDES)	MERKEZ	2018-2018	44,00	0,00	44,00	44,00	100	100
213		DKH	Kumtarla K. İçmesuyu İnş.(KÖYDES)	MERKEZ	2018-2018	72,00	0,00	72,00	72,00	100	100
214		DKH	İçmesuyu Tesis Bakım Onarım(KÖYDES)	DEVREK	2018-2018	15,00	0,00	15,00	15,00	100	100
215		DKH	Klorlama Cihazı ve Klor Temini (96 Adet)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	354,00	0,00	354,00	354,00	100	100
216		ULAŞTIRMA	Ketenciler K. Yolu Menfez Yapımı(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	33,00	0,00	33,00	33,00	100	100
217		DKH	Toyfanlı grup köyleri ilave su kaynağı 3000 m.isale hattı yapımı(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	110,00	0,00	110,00	110,00	100	100
218		DKH	İçmesuyu paket arıtma tesislerinin yenilenmesi. (6 adet)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	230,00	0,00	230,00	230,00	100	100
219		DKH	Akköy-Karakavuz köyleri isale hattı işi, 13200 m.ilave su(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	546,00	0,00	546,00	546,00	100	100
220		DKH	Öğberler Köyü sondaj, 152 m.(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	101,00	0,00	101,00	101,00	100	100
221		DKH	Yunuslu Köyü 32 m.sondaj, motopomp grubu (su seviyesi düştü)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	18,00	0,00	18,00	18,00	100	100
222		DKH	Esenköy Köyü sondaj 200 m.(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	111,00	0,00	111,00	111,00	100	100
223		DKH	Bayat Köyü şebeke yenileme işi 12500 m.hat ve depo işi(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	523,00	0,00	523,00	523,00	100	100
224		DKH	Bakırlık Köyü 50 m³ depo işi(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	34,00	0,00	34,00	34,00	100	100
225		DKH	Çevlik Köyü 75 m³ depo(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	61,00	0,00	61,00	61,00	100	100
226		DKH	Aşağıhocalar Köyü şebeke(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	142,00	0,00	142,00	142,00	100	100
227		DKH	E.Sofular Köjyü 1 adet 50 m³ depo (Çiller mh.)(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	34,00	0,00	34,00	34,00	100	100
228		DKH	Yeniköy içmesuyu şebeke yenileme.(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	179,00	0,00	179,00	179,00	100	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
229		DKH	Asarlı içmesuyu güneş enerjisi projesi(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	178,00	0,00	178,00	178,00	100	100
230		DKH	Vakıf Köyü İçmesuyu İnş.(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	200,00	0,00	200,00	121,00	61	100
231		DKH	Şamlar-Külah Grb. Çökertme Havuz İnş.(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0	75
232		DKH	Yunuslu Köyü II.Kısım İçmesuyu+ENH İnş.(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	72,00	0,00	72,00	61,00	85	100
233		DKH	Hasankahyalar İçmesuyu İnş.(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	75,00	0,00	75,00	16,00	21	70
234		DKH	Klorlama Cihazı Temini(KÖYDES)	GÖKÇEBEY	2018-2018	111,00	0,00	111,00	111,00	100	100
235		DKH	Bakiler K. Sondaj(KÖYDES)	GÖKÇEBEY	2018-2018	17,00	0,00	17,00	17,00	100	100
236		DKH	Yeşilköy K. Sondaj(KÖYDES)	GÖKÇEBEY	2018-2018	72,00	0,00	72,00	72,00	100	100
237		DKH	Bodaç K. İçmesuyu İnş(KÖYDES)	GÖKÇEBEY	2018-2018	308,00	0,00	308,00	138,00	45	40
238		DKH	Yazıcılar Köyü Kanalizasyon Tesisi Onarımı(KÖYDES)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	60,00	0,00	60,00	60,00	100	100
TOPLAM						103.628,00	4.028,00	98.643,00	85.001,00	86	95

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1		DKH	Filyos Endüstri Bölgesi Fizibilite Etüdü	ÇAYCUMA	2013-2020	11.000,00	484,00	65,00	65,00	100	0
2		DKH	Alaplı OSB	ALAPLI	2004-2019	23.510,00	14.783,00	3.430,00	3.430,00	100	100
3		DKH	Çaycuma OSB Hizmet Binası	ÇAYCUMA	2015-2021	4.069,00	0,00	1.979,00	1.979,00	100	50
TOPLAM						38.579,00	15.267,00	5.474,00	5.474,00	100	50

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1		DKH	Zonguldak Spor Kompleksi	MERKEZ	2016-2018	14.738,00	11.558,00	1,00	0,00	0	100
2		DKH	Zonguldak Merkez Stadyum Modernizasyonu	MERKEZ	2016-2018	10.283,00	10.007,00	1,00	0,00	0	100
3		DKH	Kilimli Kapalı Yüzme Havuzu	KİLİMLİ	2014-2018	5.700,00	4.902,00	1,00	0,00	0	100
4		DKH	Beycuma Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Tel Çit ve 2 li soyunma Odası Yapımı	MERKEZ	2017-2018	1.081,00	1.074,00	1,00	0,00	0	100
5		DKH	Nebioğlu Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası 2 li soyunma Odası ve 500 Kişilik Tribün Saha	ÇAYCUMA	2018-2018	1.410,00	164,00	645,00	645,00	100	50
6		DKH	Kozlu Su Sporları Merkezi	KOZLU	2017-2018	1.073,00	711,00	146,00	146,00	100	100
TOPLAM						34.285,00	28.416,00	795,00	791,00	99	92

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	2010A020060	TARIM	Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	MUHTELİF	2018-2018	27,00	25,00	1.281,00	1.281,00	100	100
2	2010A030010	TARIM	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	MUHTELİF	2018-2018	277,00	39,00	1.092,00	1.092,00	100	100
3	1985A040220	TARIM	7 Muhtelif Proje	MUHTELİF	2018-2018	45,00	153,00	45,00	45,00	100	100
4	2003A030020	TARIM	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele Projesi	MUHTELİF	2018-2018	25,00	27,00	25,00	25,00	100	100
5	1010A020040	TARIM	Bitki Sağlığı Uyg. Ve Kontrol Projesi	MUHTELİF	2018-2018	98,00	119,00	98,00	98,00	100	100
TOPLAM						472,00	363,00	2.541,00	2.541,00	100	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : ORMAN VE SU İŞLERİ ZONGULDAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	06.2	TURİZM	Korunan Alanlarda Alan Düzenleme	ALAPLI	2018-2018	130,00	0,00	130,00	130,00	100	100
2	00.01.1900	TURİZM	Korunan Alanlarda Ziyaretçi Tesisleri	ÇAYCUMA	2018-2018	90,00	0,00	90,00	90,00	100	100
3	00.01.1900	TURİZM	Etüd-Proje Çalışmaları	KDZ.EREĞLİ	2017-2018	56,00	0,00	56,00	56,00	100	100
4	00.01.1900	TURİZM	Muhtelif İşler(Alan Düzenlemeleri)	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	300,00	0,00	300,00	205,00	68	100
TOPLAM						576,00	0,00	576,00	481,00	84	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1		DKH	Muhsinler Köyü 10 adet Afet Konutu ve Çevre Düzenlemeleri	ÇAYCUMA	2017-2018	1.233,00	703,00	530,00	109,00	21	100
TOPLAM						1.233,00	703,00	530,00	109,00	21	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : TAPU KADASTRO 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1		DKH	Kadastro Yenileme ve 2B Çalışmaları	MUHTELİF	2017-2019	2.931,00	698,00	1,00	1.080,00	108.000	100
TOPLAM						2.931,00	698,00	1,00	1.080,00	108.000	100

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1	200K171660	DKH	İl Müdürlüğü Hizmet Binası	MERKEZ	2017-2019	10.775,00	10.472,00	88,00	88,00	100	100
2	1991K171310	DKH	Devrek Huzurevi Yapımı(60 Kişilik)	DEVREK	2018-2020	13.500,00	3.174,00	9.924,00	2.000,00	20	25
TOPLAM						24.275,00	13.646,00	10.012,00	2.088,00	21	63

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIMCI KURULUŞ : BAŞKENT ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş. **Bin TL**

S NO	PROJE NO	SEKTÖR	PROJENİN ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJE YERİ	BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI HARCAMASI	GERÇEKLEŞME DURUMU	
										NAKDİ GERÇEKLEŞME	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
1		ENERJİ	Merkez İlçe 65 Adet Muhtelif Proje	MERKEZ	2018-2018	22.601,00	0,00	22.601,00	22.601,00	100	100
2		ENERJİ	Alaplı İlçesi 50 Adet Muhtelif Proje	ALAPLI	2018-2018	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	100	100
3		ENERJİ	Çaycuma İlçesi 76 Adet Muhtelif Proje	ÇAYCUMA	2018-2018	4.027,00	0,00	4.027,00	4.027,00	100	100
4		ENERJİ	Devrek İlçesi 50 Adet Muhtelif Proje	DEVREK	2018-2018	4.746,00	0,00	4.746,00	4.746,00	100	100
5		ENERJİ	Ereğli İlçesi 93 Adet Muhtelif Proje	KDZ.EREĞLİ	2018-2018	8.563,00	0,00	8.563,00	8.563,00	100	100
6		ENERJİ	Gökçebey İlçesi 11 Adet Muhtelif Proje	GÖKÇEBEY	2018-2018	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	100	100
7		ENERJİ	Kilimli İlçesi 16 Adet Muhtelif Proje	KİLİMLİ	2018-2018	17.644,00	0,00	17.644,00	17.644,00	100	100
8		ENERJİ	Kozlu İlçesi 17 Adet Muhtelif Proje	KOZLU	2018-2018	12.204,00	0,00	12.204,00	12.204,00	100	100
TOPLAM						73.877,00	0,00	73.877,00	73.877,00	100	100
